KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN ENDE

Jln. Ahmad Yani
Ende 86316

Telp. (0381) 21356
Fax. (0381) 22172

Media Sosial : @bandara_ende
Email : endebandara@gmail.com
bandara_nd@yahoo.co.id

DOKUMEN LAPORAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN :

NORMALISASI RUNWAY STRIP

K O N T R A K :
Nomor : KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal : 04 SEPTEMBER 2025

TAHUN ANGGARAN :
2025

SUMBER DANA
A P B N

PENYEDIA JASA	KONSULTAN PENGAWAS
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER Kantor Graha Inti Perkasa Jl. Raden Inten II no.150 B RT.008 RW 005 Kel.Duren Sawit Jakarta Timur 13440 Telp.(021) 48672407,8625301, Email: Ptsamudraa@yahoo.co.id	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA Engineering & Management Consultant

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	-
Minggu Ke -	:	- 1 (Satu)
Periode Tanggal	:	04 September 2025 s/d 07 September 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,39	0,00	0,17	0,17
II	PEKERJAAN TANAH	52,99	0,00	0,00	0,00
III	PEKERJAAN DRAINASE	31,53	0,00	0,00	0,00
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	10,46	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	3,63	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	0,00	0,17	0,17
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				0,17
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				0,18
	3. DEVIASI				-0,01

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 1 (Satu)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	-
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 1															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,28	0,09	0,09															0,09	
2	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja																					
	a. Penyiapan RK3K	1,00	pkt	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	pkt	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	pkt	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	pkt	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	pkt	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	**PEKERJAAN TANAH**																					
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	32.071,14	m2	7,48			2,49	2,49	2,49													
2	Pekerjaan Galian Tanah	15.932,90	m3	20,72							3,45	3,45	3,45	3,45	3,45							
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	8.842,71	m3	24,79								4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13					
III	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE I PANJANG 255,56 M**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	715,57	m	0,69								0,23	0,23	0,23								
a.2	Galian Tanah Drainase	733,14	m3	0,95								0,32	0,32	0,32								
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	37,05	m3	0,05								0,02	0,02	0,02								
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	18,52	m3	0,20								0,07	0,07	0,07								
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	431,57	m3	6,97								2,32	2,32	2,32								
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	93,27	m2	0,06								0,02	0,02	0,02								
B.	**TYPE II PANJANG 351,72 M**																					
b.1	Pemasangan Bouwplank	1.132,53	m'	1,09											0,55	0,55						
b.2	Galian Tanah Drainase	1.314,01	m3	1,71											0,85	0,85						
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	56,99	m3	0,07											0,03	0,04						
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	25,49	m3	0,27											0,14	0,14						
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	217,44	m3	3,51											1,76	1,76						
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	128,37	m2	0,08											0,04	0,04						
C.	**TYPE III PANJANG 220,62 M**																					
c.1	Pemasangan Bouwplank	1.058,99	m'	1,02													0,51	0,51				
c.2	Galian Tanah Drainase	2.223,89	m3	2,89													1,45	1,45				
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	39,71	m3	0,05													0,03	0,03				
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	19,85	m3	0,21													0,11	0,11				
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	305,78	m3	4,94													2,47	2,47				
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	80,52	m2	0,05													0,02	0,02				
D.	**TYPE IV PANJANG 115,12 M**																					
d.1	Pemasangan Bouwplank	713,75	m'	0,69															0,34	0,34		
d.2	Galian Tanah Drainase	2.069,88	m3	2,69															1,35	1,35		
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	29,91	m3	0,04															0,02	0,02		
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	14,96	m3	0,16															0,08	0,08		
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	192,82	m3	3,11															1,56	1,56		
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	42,01	m2	0,03															0,01	0,01		
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	1.471,00	Buah	3,64													0,91	0,91	0,91	0,91		
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	3.530,40	m	0,82													1,70	1,70	1,70	1,70		
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	88,82	m3	0,12																0,06	0,06	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	40,37	m3	0,20																0,10	0,10	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	32,30	m3	0,22																0,11	0,11	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	161,50	m2	0,06																0,03	0,03	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	21,70	Ton	0,42																0,22	0,22	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	161,50	m2	0,02																0,01	0,01	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	14,47	Ton	0,30																0,15	0,15	
B.	**PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK**																					
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	1.350,48	m2	0,17																	0,17	
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	103,68	Ton	2,11																	2,11	
				100,00																		
	RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52	3,52	10,62	10,62	10,62	11,01	7,56	11,39	7,26	6,04	6,71	3,11	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54	15,05	25,67	36,29	46,91	57,92	65,48	76,88	84,14	90,18	96,89	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17																	
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17																	
	DEVIASI				-0,01																	

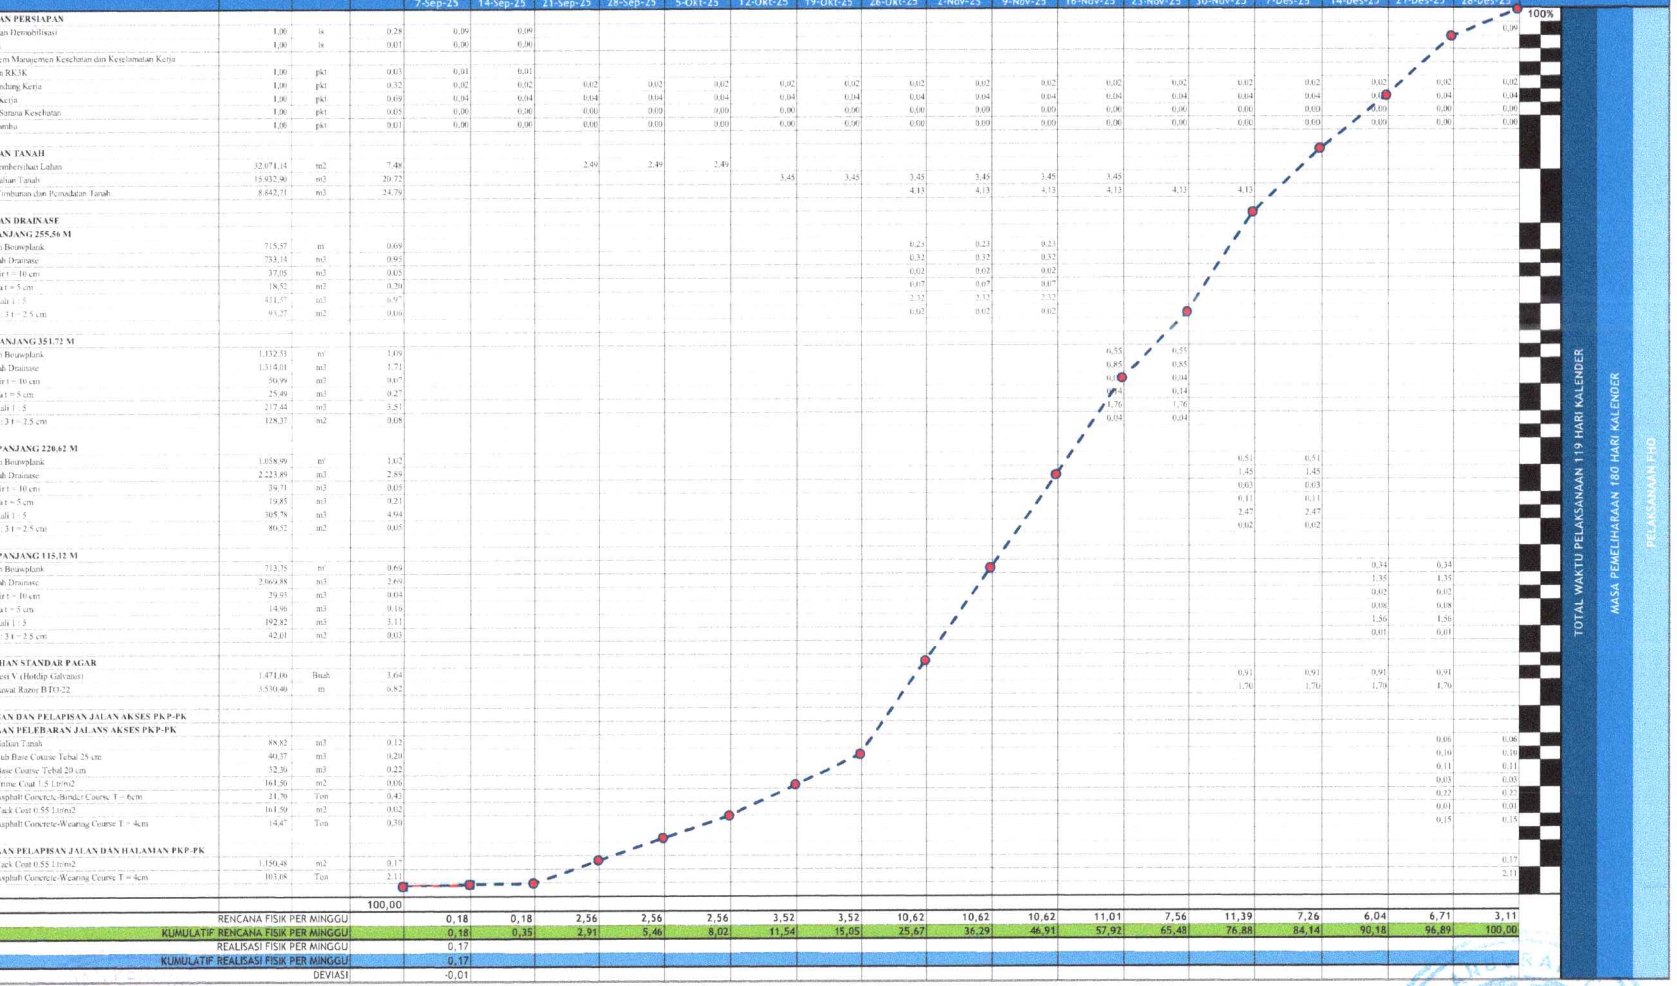

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2025 s/d 07 SEPTEMBER 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	-
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Minggu ke	: - 1 (Satu)
Bulan/Tahun	: SEPTEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	KONTRAK			REALISASI YANG DICAPAI								
		Volume		Bobot (%)	S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
					Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
1	2	3		6	7	10	11	12	15	16	17	20	21
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,28	-	-	-	0,31	30,77	0,09	0,31	30,77	0,09
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	-	-	-	0,50	50,00	0,00	0,50	50,00	0,00
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	-	-	-	0,50	50,00	0,01	0,50	50,00	0,01
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,32	-	-	-	0,06	6,06	0,02	0,06	6,06	0,02
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,69	-	-	-	0,06	6,06	0,04	0,06	6,06	0,04
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	-	-	-	0,06	6,06	0,00	0,06	6,06	0,00
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	-	-	-	0,06	6,06	0,00	0,06	6,06	0,00
		Sub Jumlah (I)		1,39			-			0,17			0,17
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	32.071,14	7,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	15.932,90	20,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	m3	8.842,71	24,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (II)		52,99			-			-			-
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE I PANJANG 255,56 M												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m'	715,57	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	733,14	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	37,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	18,52	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	431,57	6,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	93,27	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	TYPE II PANJANG 351,72 M												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.132,53	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.314,01	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	50,99	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	25,49	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	217,44	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	128,37	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	TYPE III PANJANG 220,62 M												
c.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.058,99	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.223,89	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	39,71	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	19,85	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	305,78	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	80,52	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	TYPE IV PANJANG 115,12 M												
d.1	Pemasangan Bouwplank	m'	713,75	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.069,88	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	29,93	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	14,96	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	192,82	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,01	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (III)		31,53									
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi-V (Hotdip Galvanis)	Buah	1.471,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	3.530,40	6,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (IV)		10,46									
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	88,82	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	40,37	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	32,30	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	161,50	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	21,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	161,50	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	14,47	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK												
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	1.150,48	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	103,08	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (V)		3,63									
		JUMLAH (I s/d V)		100,00			-			0,17			0,17

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	-2 (dua)
Periode Tanggal	:	08 September 2025 s/d 14 September 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,39	0,17	0,18	0,35
II	PEKERJAAN TANAH	52,99	0,00	0,00	0,00
III	PEKERJAAN DRAINASE	31,53	0,00	0,00	0,00
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	10,46	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	3,63	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	0,17	0,18	0,35
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				0,35
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				0,35
	3. DEVIASI				-0,01

Disetujui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
Direksi Pengawas	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
MATHEOS BORU	Ir. ANDARIAS LINO PADANG	NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Penata Muda Tk. I (III/d)	Team Leader	Manager Teknik
NIP. 19801206 200212 1 005		

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE -2 (dua)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 2															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,28	0,09	0,09																
2	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja																					
	a. Penyusun RKTK	1,00	pkt	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	pkt	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	pkt	0,69	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	pkt	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	pkt	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	**PEKERJAAN TANAH**																					
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	32.071,14	m2	7,48			2,49	2,49	2,49													
2	Pekerjaan Galian Tanah	15.932,90	m3	20,72						3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45							
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	8.842,71	m3	24,79								4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13					
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE I PANJANG 255,56 M**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	715,57	m'	0,69								0,23	0,23	0,23								
a.2	Galian Tanah Drainase	783,14	m3	0,95								0,32	0,32	0,32								
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	37,05	m3	0,05								0,02	0,02	0,02								
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	18,52	m3	0,20								0,07	0,07	0,07								
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	431,57	m3	0,97								2,32	2,32	2,32								
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	93,27	m2	0,06								0,02	0,02	0,02								
B.	**TYPE II PANJANG 351,72 M**																					
b.1	Pemasangan Bouwplank	1.132,53	m'	1,09											0,55	0,55						
b.2	Galian Tanah Drainase	1.314,01	m3	1,71											0,85	0,85						
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	50,59	m3	0,07											0,03	0,04						
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	25,49	m3	0,27											0,13	0,14						
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	217,44	m3	3,51											1,76	1,76						
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	128,37	m2	0,08											0,04	0,04						
C.	**TYPE III PANJANG 220,62 M**																					
c.1	Pemasangan Bouwplank	1.058,99	m'	1,02													0,51	0,51				
c.2	Galian Tanah Drainase	2.223,89	m3	2,89													1,45	1,45				
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	39,71	m3	0,05													0,03	0,03				
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	19,85	m3	0,21													0,11	0,13				
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	305,78	m3	4,94													2,47	2,47				
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	80,52	m2	0,05													0,02	0,02				
D.	**TYPE IV PANJANG 115,12 M**																					
d.1	Pemasangan Bouwplank	713,75	m'	0,69															0,34	0,34		
d.2	Galian Tanah Drainase	2.669,88	m3	2,69															1,35	1,35		
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	29,93	m3	0,04															0,02	0,02		
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	14,96	m3	0,16															0,08	0,08		
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	392,82	m3	3,11															1,56	1,56		
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	42,01	m2	0,03															0,01	0,01		
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Holdip Galvanis)	1.471,00	Buah	3,64													0,91	0,91	0,91	0,91		
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	3.530,40	m	0,82													1,70	1,70	1,70	1,70		
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	88,82	m3	0,12																0,06	0,06	
a.2	Pekerjaan Sib Base Course Tebal 25 cm	40,37	m3	0,20																0,10	0,10	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	32,30	m3	0,22																0,11	0,11	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	161,50	m2	0,05																0,03	0,03	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course, T = 6cm	21,70	Ton	0,43																0,22	0,22	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	161,50	m2	0,02																0,01	0,01	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course, T = 4cm	14,47	Ton	0,30																0,15	0,15	
B.	**PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK**																					
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	1.150,48	m2	0,17																	0,17	
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course, T = 4cm	103,08	Ton	2,11																	2,11	
				100,00																		
	RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52	3,52	10,62	10,62	10,62	11,01	7,56	11,39	7,26	6,04	6,71	3,11	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54	15,05	25,67	36,29	46,91	57,92	65,48	76,88	84,14	90,18	96,89	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,18																
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,35																
	DEVIASI				-0,01	-0,01																

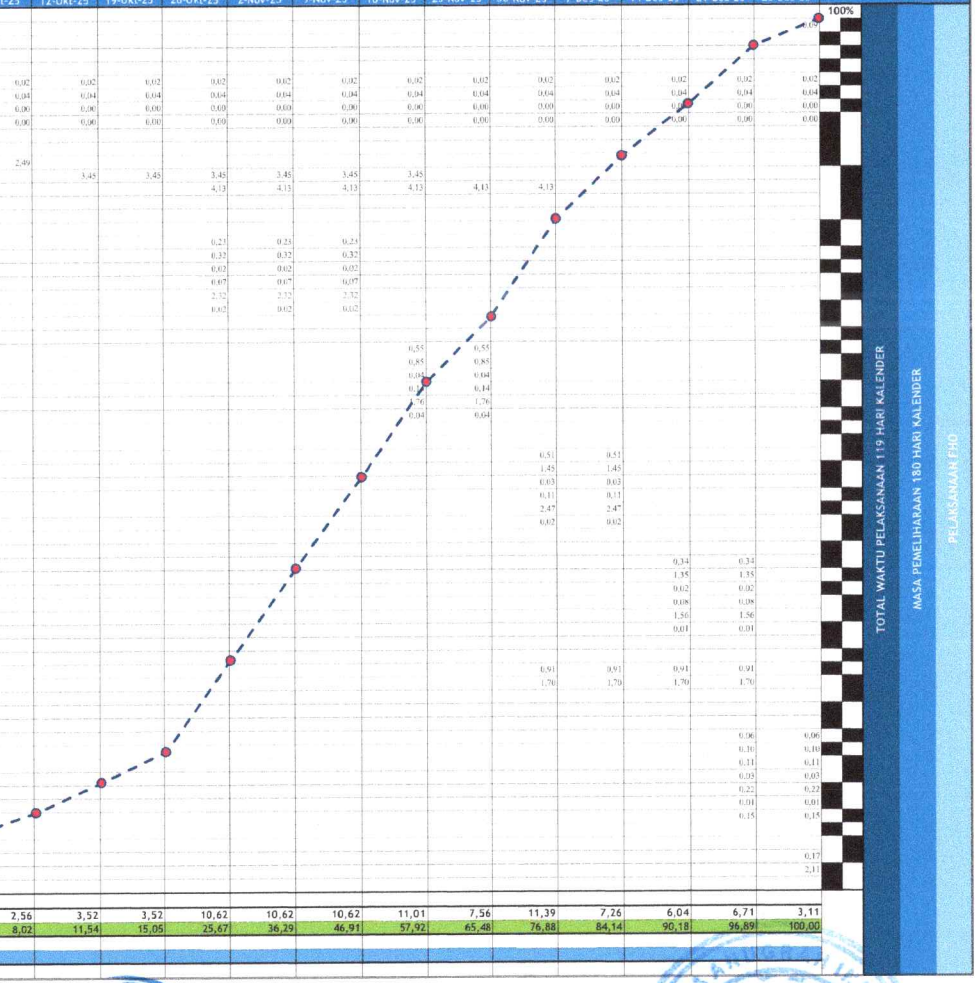

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/b)

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2025 s/d 14 SEPTEMBER 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	-2 (dua)
Bulan/Tahun	:	SEPTEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	KONTRAK			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
			Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,28	0,31	30,77	0,085	0,33	33,33	0,09	0,64	64,10	0,18
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	0,50	50,00	0,005	0,50	50,00	0,00	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	0,50	50,00	0,015	0,50	50,00	0,01	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,32	0,06	6,06	0,020	0,06	5,88	0,02	0,12	11,94	0,04
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,69	0,06	6,06	0,042	0,06	5,88	0,04	0,12	11,94	0,08
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,06	6,06	0,003	0,06	5,88	0,00	0,12	11,94	0,01
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,06	6,06	0,001	0,06	5,88	0,00	0,12	11,94	0,00
		Sub Jumlah (I)		1,39			0,17			0,18			0,35
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	32.071,14	7,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	15.932,90	20,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	m3	8.842,71	24,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (II)		52,99			-			-			-
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE I PANJANG 255,56 M												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m'	715,57	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	733,14	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	37,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	18,52	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	431,57	6,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	93,27	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	TYPE II PANJANG 351,72 M												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.132,53	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.314,01	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	50,99	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	25,49	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	217,44	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	128,37	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	TYPE III PANJANG 220,62 M												
c.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.058,99	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.223,89	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	39,71	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	19,85	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	305,78	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	80,52	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	TYPE IV PANJANG 115,12 M												
d.1	Pemasangan Bouwplank	m'	713,75	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.069,88	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	29,93	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	14,96	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	192,82	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,01	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (III)		31,53									
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Holdip Galvanis)	Buah	1.471,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	3.530,40	6,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (IV)		10,46									
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	88,82	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	40,37	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	32,30	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	161,50	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	21,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	161,50	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	14,47	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK												
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	1.150,48	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	103,08	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (V)		3,63			-			-			-
		JUMLAH (I s/d V)		100,00			0,17			0,18			0,35

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat :
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	-3 (Tiga)
Periode Tanggal	:	15 September 2025 s/d 21 September 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,39	0,35	0,06	0,41
II	PEKERJAAN TANAH	52,99	0,00	0,00	0,00
III	PEKERJAAN DRAINASE	31,53	0,00	0,00	0,00
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	10,46	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	3,63	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	0,35	0,06	0,41
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				0,41
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				2,91
	3. DEVIASI				-2,50

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE -3 (Tiga)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 3															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,28	0,09	0,09																
2	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3	SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja																					
	a. Peralatan RKSK	1,00	pkt	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	pkt	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Perawat Kerja	1,00	pkt	0,69	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	pkt	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	pkt	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	**PEKERJAAN TANAH**																					
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	32.071,14	m2	7,48			2,49	2,49	2,49													
2	Pekerjaan Galian Tanah	15.932,90	m3	20,72						3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45							
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	8.842,71	m3	24,79								4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13					
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE I PANJANG 255,56 M**																					
a.1	Pemasangan Bowsplank	715,57	m'	0,69								0,23	0,23	0,23								
a.2	Galian Tanah Drainase	733,14	m3	0,95								0,32	0,32	0,32								
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	37,05	m3	0,05								0,02	0,02	0,02								
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	18,52	m3	0,20								0,07	0,07	0,07								
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	431,57	m3	6,97								2,32	2,32	2,32								
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	93,27	m2	0,06								0,02	0,02	0,02								
B.	**TYPE II PANJANG 351,72 M**																					
b.1	Pemasangan Bowsplank	1.132,53	m'	1,09											0,55	0,55						
b.2	Galian Tanah Drainase	1.314,01	m3	1,71											0,85	0,85						
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	50,99	m3	0,07											0,04	0,04						
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	25,49	m3	0,27											0,14	0,14						
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	217,44	m3	3,51											1,76	1,76						
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	128,27	m2	0,08											0,04	0,04						
C.	**TYPE III PANJANG 220,62 M**																					
c.1	Pemasangan Bowsplank	1.058,99	m'	1,02													0,51	0,51				
c.2	Galian Tanah Drainase	2.223,89	m3	2,89													1,45	1,45				
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	39,71	m3	0,05													0,03	0,03				
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	19,85	m3	0,21													0,11	0,11				
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	305,78	m3	4,94													2,47	2,47				
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	80,52	m2	0,05													0,02	0,02				
D.	**TYPE IV PANJANG 115,12 M**																					
d.1	Pemasangan Bowsplank	713,75	m'	0,69															0,34	0,34		
d.2	Galian Tanah Drainase	2.069,88	m3	2,69															1,35	1,35		
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	29,93	m3	0,04															0,02	0,02		
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	14,96	m3	0,16															0,08	0,08		
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	192,82	m3	3,11															1,56	1,56		
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	42,01	m2	0,03															0,01	0,01		
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1	Pasangan Besi V (Holdip Galvanis)	1.471,00	Buah	3,64													0,91	0,91	0,91	0,91		
2	Pasangan Kawat Razor BTO-22	3.530,40	m	6,82													1,70	1,70	1,70	1,70		
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	88,82	m3	0,12																0,06	0,06	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	46,37	m3	0,20																0,10	0,10	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	32,30	m3	0,22																0,11	0,11	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	161,50	m2	0,06																0,03	0,03	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	21,70	Ton	0,43																0,22	0,22	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	161,50	m2	0,02																0,01	0,01	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	14,47	Ton	0,30																0,15	0,15	
B.	**PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK**																					
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	1.150,48	m2	0,17																	0,17	
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	103,08	Ton	2,11																	2,11	
				100,00																		
	RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52	3,52	10,62	10,62	10,62	11,01	7,56	11,39	7,26	6,04	6,71	3,11	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54	15,05	25,67	36,29	46,91	57,92	65,48	76,88	84,14	90,18	96,89	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,18	0,06															
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,345	0,41															
	DEVIASI				-0,01	-0,01	-2,50															

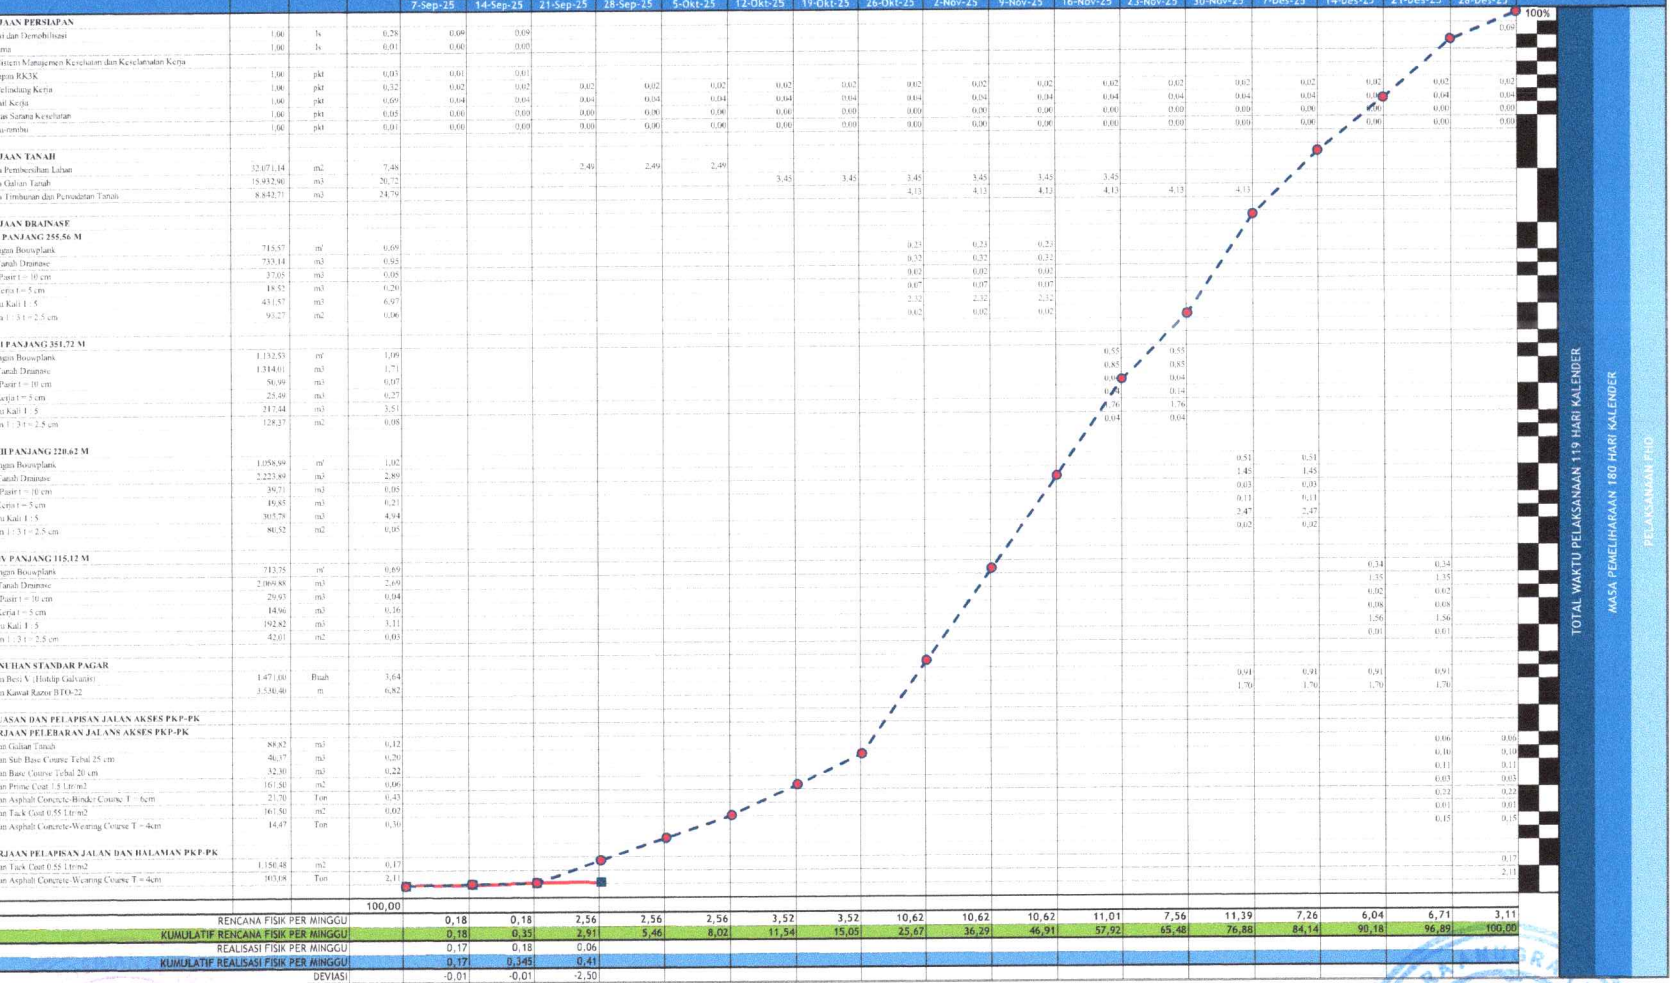

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 15 September 2025 s/d 21 September 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	-3 (Tiga)
Bulan/Tahun	:	SEPTEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	KONTRAK			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,28	0,64	64,10	0,178	-	-	-	0,64	64,10	0,18
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,010	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,030	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,32	0,12	11,94	0,038	0,06	5,88	0,02	0,18	17,83	0,06
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,69	0,12	11,94	0,083	0,06	5,88	0,04	0,18	17,83	0,12
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,12	11,94	0,006	0,06	5,88	0,00	0,18	17,83	0,01
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,12	11,94	0,001	0,06	5,88	0,00	0,18	17,83	0,00
		Sub Jumlah (I)		**1,39**			0,35			0,06			0,41
II.	**PEKERJAAN TANAH**												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	32.071,14	7,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	15.932,90	20,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	m3	8.842,71	24,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (II)		**52,99**			-			-			-
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**												
A.	**TYPE I PANJANG 255,56 M**												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m'	715,57	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	733,14	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	37,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	18,52	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	431,57	6,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	93,27	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	**TYPE II PANJANG 351,72 M**												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.132,53	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.314,01	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	50,99	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	25,49	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	217,44	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	128,37	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	**TYPE III PANJANG 220,62 M**												
c.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.058,99	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.223,89	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	39,71	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	19,85	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	305,78	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	80,52	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	**TYPE IV PANJANG 115,12 M**												
d.1	Pemasangan Bouwplank	m'	713,75	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.069,88	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	29,93	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	14,96	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	192,82	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,01	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (III)		**31,53**									
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	1.471,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	3.530,40	6,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (IV)		**10,46**									
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**												
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK**												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	88,82	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	40,37	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	32,30	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	161,50	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	21,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	161,50	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	14,47	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	**PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK**												
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	1.150,48	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	103,08	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (V)		**3,63**			-			-			-
		JUMLAH (I s/d V)		100,00			0,35			0,06			0,41

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	-4 (Empat)
Periode Tanggal	:	22 September 2025 s/d 28 September 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,39	0,41	0,06	0,47
II	PEKERJAAN TANAH	52,99	0,00	2,62	2,62
III	PEKERJAAN DRAINASE	31,53	0,00	0,00	0,00
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	10,46	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	3,63	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	0,41	2,68	3,09
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				3,09
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				5,46
	3. DEVIASI				-2,37

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE -4 (Empat)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 4															KETERANGAN
					1 4-Sep-25 7-Sep-25	2 8-Sep-25 14-Sep-25	3 15-Sep-25 21-Sep-25	4 22-Sep-25 28-Sep-25	5 29-Sep-25 5-Okt-25	6 6-Okt-25 12-Okt-25	7 13-Okt-25 19-Okt-25	8 20-Okt-25 26-Okt-25	9 27-Okt-25 2-Nov-25	10 3-Nov-25 9-Nov-25	11 10-Nov-25 16-Nov-25	12 17-Nov-25 23-Nov-25	13 24-Nov-25 30-Nov-25	14 1-Des-25 7-Des-25	15 8-Des-25 14-Des-25	16 15-Des-25 21-Des-25	17 22-Des-25 28-Des-25	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,28	0,09	0,09														0,09
2	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00														
3	SMKS (Sistem Manajemen Keselatan dan Keselamatan Kerja																			
	a. Penyiapan RKSK	1,00	pkt	0,03	0,01	0,01														
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	pkt	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	c. Personil Kerja	1,00	pkt	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	pkt	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Rambu-rambu	1,00	pkt	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**PEKERJAAN TANAH**																			
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	32.071,14	m2	7,48			2,49	2,49	2,49											
2	Pekerjaan Galian Tanah	15.932,90	m3	20,72						3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45					
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	8.842,71	m3	24,79								4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13			
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																			
A.	**TYPE I PANJANG 255,56 M**																			
a.1	Pemasangan Bowwplank	715,57	m'	0,69								0,23	0,23	0,23						
a.2	Galian Tanah Drainase	733,14	m3	0,95								0,32	0,32	0,32						
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	37,05	m3	0,05								0,02	0,02	0,02						
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	18,52	m3	0,20								0,07	0,07	0,07						
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	431,57	m3	6,97								2,32	2,32	2,32						
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	93,27	m2	0,06								0,02	0,02	0,02						
B.	**TYPE II PANJANG 351,72 M**																			
b.1	Pemasangan Bowwplank	1.132,53	m'	1,09											0,55	0,55				
b.2	Galian Tanah Drainase	1.314,01	m3	1,71											0,85	0,85				
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	50,99	m3	0,07											0,04	0,04				
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	25,49	m3	0,27											0,14	0,14				
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	247,44	m3	3,51											1,76	1,76				
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	128,37	m2	0,08											0,04	0,04				
C.	**TYPE III PANJANG 220,62 M**																			
c.1	Pemasangan Bowwplank	1.058,99	m'	1,02													0,51	0,51		
c.2	Galian Tanah Drainase	2.223,89	m3	2,89													1,45	1,45		
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	39,71	m3	0,05													0,03	0,03		
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	19,85	m3	0,21													0,11	0,11		
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	365,79	m3	4,94													2,47	2,47		
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	80,52	m2	0,05													0,02	0,02		
D.	**TYPE IV PANJANG 135,12 M**																			
d.1	Pemasangan Bowwplank	733,75	m'	0,69															0,34	0,34
d.2	Galian Tanah Drainase	2.069,88	m3	2,69															1,35	1,35
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	29,93	m3	0,04															0,02	0,02
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	14,96	m3	0,16															0,08	0,08
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	192,82	m3	3,11															1,56	1,56
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	42,01	m2	0,03															0,01	0,01
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																			
1.	Pasangan Besi V (Hollip Galvanis)	1.471,00	Buah	3,64													0,91	0,91	0,91	0,91
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	3.530,40	m	6,82													1,70	1,70	1,70	1,70
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																			
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK**																			
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	88,82	m3	0,12																0,06
a.2	Pekerjaan Sub Base Coarse Tebal 25 cm	40,37	m3	0,20																0,10
a.3	Pekerjaan Base Coarse Tebal 20 cm	32,30	m3	0,22																0,11
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	161,50	m2	0,06																0,03
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course, T = 6cm	21,70	Ton	0,42																0,22
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	161,50	m2	0,02																0,01
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	14,47	Ton	0,30																0,15
B.	**PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK**																			
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	1.150,48	m2	0,17																0,17
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	163,08	Ton	2,11																2,11
				100,00																
	RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52	3,52	10,62	10,62	10,62	11,01	7,56	11,39	7,26	6,04	6,71	3,11
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54	15,05	25,67	36,29	46,91	57,92	65,48	76,88	84,14	90,18	96,89	100,00
	REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,18	0,06	2,68													
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,35	0,41	3,09													
	DEVIASI				-0,01	-0,01	-2,50	-2,37													

100%

TOTAL WAKTU PELAKSANAAN 119 HARI KALENDER
MASA PEMELIHARAAN 180 HARI KALENDER
PELAKSANAAN FHO

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Pengatur Muda Tk. I (III/b)

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

IR. ANDARIAS LINO PEDANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 22 September 2025 s/d 28 September 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	-4 (Empat)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	KONTRAK			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,28	0,64	64,10	0,18	-	-	-	0,64	64,10	0,18
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,32	0,18	17,83	0,06	0,06	5,88	0,02	0,24	23,71	0,08
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,69	0,18	17,83	0,12	0,06	5,88	0,04	0,24	23,71	0,16
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,18	17,83	0,01	0,06	5,88	0,00	0,24	23,71	0,01
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,18	17,83	0,00	0,06	5,88	0,00	0,24	23,71	0,00
	Sub Jumlah (I)			**1,39**			**0,41**			**0,06**			**0,47**
II.	**PEKERJAAN TANAH**												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	32.071,14	7,48	-	-	-	11.224,90	35,00	2,62	11.224,90	35,00	2,62
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	15.932,90	20,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	m3	8.842,71	24,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (II)			**52,99**			**-**			**2,62**			**2,62**
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**												
A.	**TYPE I PANJANG 255,56 M**												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m'	715,57	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	733,14	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	37,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	18,52	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	431,57	6,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	93,27	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	**TYPE II PANJANG 351,72 M**												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.132,53	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.314,01	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	50,99	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	25,49	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	217,44	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	128,37	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	**TYPE III PANJANG 220,62 M**												
c.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.068,99	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.223,89	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	39,71	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	19,85	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	305,78	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	80,52	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	**TYPE IV PANJANG 115,12 M**												
d.1	Pemasangan Bouwplank	m'	713,75	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.069,88	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	29,93	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	14,96	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	192,82	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,01	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (III)			**31,53**			**-**			**-**			**-**
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**												
1.	Pasangan Besi V (Holdp Galvanis)	Buah	1.471,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	3.530,40	6,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (IV)			**10,46**			**-**			**-**			**-**
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**												
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK**												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	88,82	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	40,37	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	32,30	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	m2	161,50	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	21,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	m2	161,50	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	14,47	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	**PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK**												
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	m2	1.150,48	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	103,08	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (V)			**3,63**			-			-			-
	JUMLAH (I s/d V)			100,00			0,41			2,68			3,09

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE CONTRACTOR & SUPPLIER

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 5 (Lima)
Periode Tanggal	:	29 September 2025 s/d 05 Oktober 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,39	0,47	0,06	0,53
II	PEKERJAAN TANAH	52,99	2,62	4,86	7,48
III	PEKERJAAN DRAINASE	31,53	0,00	0,00	0,00
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	10,46	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	3,63	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	3,09	4,92	8,01
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				8,01
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				8,02
	3. DEVIASI				-0,01

Disetujui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
Direksi Pengawas	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
MATHEOS BORU	Ir. ANDARIAS LINO PADANG	NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Penata Muda Tk. I (III/d)	Team Leader	Manager Teknik
NIP. 19801206 200212 1 005		

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 5 (Lima)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroebosman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 5															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,28	0,09	0,09																
2	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3	SMK3 (Sistem Manajemen Keselatan dan Keselamatan Kerja																					
	a. Penyiapan RK3K	1,00	pkt	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	pkt	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	pkt	0,69	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	pkt	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	pkt	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	PEKERJAAN TANAH																					
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	32.471,14	m2	7,48			2,49	2,49	2,49													
2	Pekerjaan Galian Tanah	15.932,90	m3	20,72						3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45							
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	8.842,71	m3	24,79								4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13					
III	PEKERJAAN DRAINASE																					
A.	TYPE I PANJANG 255,56 M																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	715,57	m'	0,69								0,23	0,23	0,23								
a.2	Galian Tanah Drainase	733,14	m3	0,95								0,32	0,32	0,32								
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	37,05	m3	0,05								0,02	0,02	0,02								
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	19,52	m3	0,20								0,07	0,07	0,07								
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	431,57	m3	4,59								2,32	2,32	2,32								
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	90,27	m2	0,96								0,02	0,02	0,02								
B.	TYPE II PANJANG 351,72 M																					
b.1	Pemasangan Bouwplank	1.132,53	m'	1,09											0,55	0,55						
b.2	Galian Tanah Drainase	1.314,01	m3	1,71											0,85	0,85						
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	50,99	m3	0,07											0,03	0,04						
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	25,49	m3	0,27											0,13	0,14						
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	217,44	m3	3,51											1,76	1,76						
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	128,37	m2	0,08											0,04	0,04						
C.	TYPE III PANJANG 220,62 M																					
c.1	Pemasangan Bouwplank	1.058,99	m'	1,02													0,51	0,51				
c.2	Galian Tanah Drainase	2.223,89	m3	2,89													1,45	1,45				
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	39,71	m3	0,05													0,03	0,03				
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	19,85	m3	0,21													0,11	0,11				
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	305,78	m3	4,94													2,47	2,47				
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	80,52	m2	0,05													0,02	0,02				
D.	TYPE IV PANJANG 135,12 M																					
d.1	Pemasangan Bouwplank	713,75	m'	0,69															0,34	0,34		
d.2	Galian Tanah Drainase	2.169,88	m3	2,69															1,35	1,35		
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	29,93	m3	0,04															0,02	0,02		
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	14,96	m3	0,16															0,08	0,08		
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	192,82	m3	3,11															1,56	1,56		
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	42,01	m2	0,03															0,01	0,01		
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	1.471,00	Buah	3,64													0,91	0,91	0,91	0,91		
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	3.530,40	m	6,82													1,70	1,70	1,70	1,70		
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK																					
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	88,82	m3	0,12																0,06	0,06	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	40,37	m3	0,20																0,10	0,10	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	32,30	m3	0,22																0,11	0,11	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	161,50	m2	0,06																0,03	0,03	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course, T = 6cm	21,70	Ton	0,43																0,22	0,22	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	161,50	m2	0,02																0,01	0,01	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	14,47	Ton	0,30																0,15	0,15	
B.	PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK																					
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	1.150,48	m2	0,17																	0,17	
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	103,08	Ton	2,11																	2,11	
				100,00																		
	RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52	3,52	10,62	10,62	10,62	11,01	7,56	11,39	7,26	6,04	6,71	3,11	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54	15,05	25,67	36,29	46,91	57,92	65,48	76,88	84,14	90,18	96,89	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92													
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01													
	DEVIASI				-0,01	-0,01	-2,50	-2,37	-0,01													

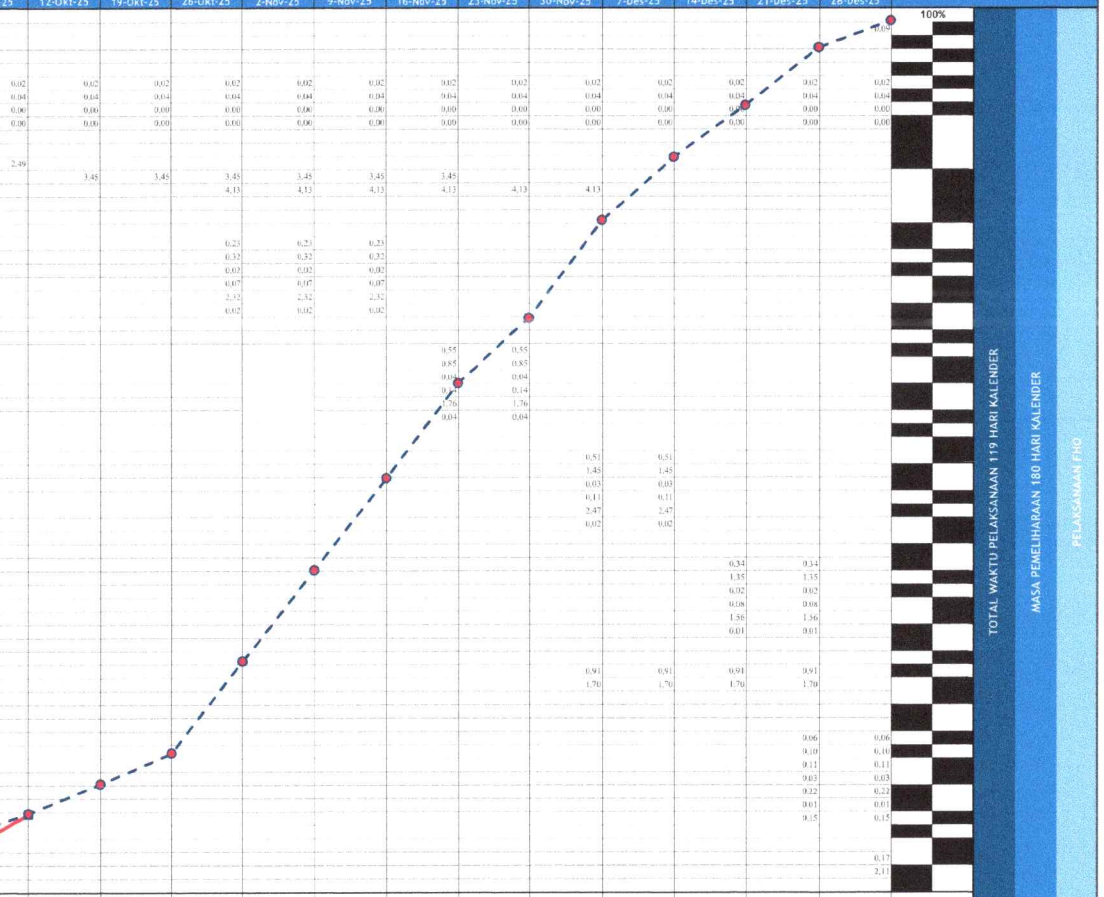

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/b)

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - OKTOBER 2025

PERIODE TANGGAL : 29 September 2025 s/d 05 Oktober 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 5 (Lima)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - OKTOBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	KONTRAK			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,28	0,64	64,10	0,18	-	-	-	0,64	64,10	0,18
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,32	0,24	23,71	0,08	0,06	5,88	0,02	0,30	29,59	0,10
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,69	0,24	23,71	0,16	0,06	5,88	0,04	0,30	29,59	0,21
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,24	23,71	0,01	0,06	5,88	0,00	0,30	29,59	0,01
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,24	23,71	0,00	0,06	5,88	0,00	0,30	29,59	0,00
	Sub Jumlah (I)			**1,39**			**0,47**			**0,06**			**0,53**
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	32.071,14	7,48	11.224,90	35,00	2,62	20.846,24	65,00	4,86	32.071,14	100,00	7,48
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	15.932,90	20,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	m3	8.842,71	24,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (II)			**52,99**			**2,62**			**4,86**			**7,48**
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE I PANJANG 255,56 M												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m'	715,57	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	733,14	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	37,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	18,52	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	431,57	6,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	93,27	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	TYPE II PANJANG 351,72 M												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.132,53	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.314,01	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	50,99	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	25,49	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	217,44	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	128,37	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	TYPE III PANJANG 220,62 M												
c.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.058,99	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.223,89	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	39,71	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	19,85	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	305,78	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	80,52	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	TYPE IV PANJANG 115,12 M												
d.1	Pemasangan Bouwplank	m'	713,75	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.069,88	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	29,93	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	14,96	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	192,82	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,01	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (III)			**31,53**			-			-			-
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	1.471,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	3.530,40	6,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (IV)			**10,46**			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	88,82	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	40,37	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	32,30	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	m2	161,50	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	21,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	m2	161,50	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	14,47	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK												
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	m2	1.150,48	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	103,08	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (V)			**3,63**			-			-			-
	JUMLAH (I s/d III)			100,00			3,09			4,92			8,01

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 6 (Enam)
Periode Tanggal	:	06 Oktober 2025 s/d 12 Oktober 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,39	0,53	0,06	0,60
II	PEKERJAAN TANAH	52,99	7,48	8,50	15,98
III	PEKERJAAN DRAINASE	31,53	0,00	0,00	0,00
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	10,46	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	3,63	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	8,01	8,56	16,58
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				16,58
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				11,54
	3. DEVIASI				5,04

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 6 (Enam)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 6															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,28	0,09	0,09															0,09	
2	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja																					
	a. Penyiapan RKSK	1,00	pkt	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	pkt	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	pkt	0,69	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	pkt	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	pkt	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	**PEKERJAAN TANAH**																					
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	32.071,14	m2	7,48			2,49	2,49	2,49													
2	Pekerjaan Galian Tanah	15.932,90	m3	20,72						3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45							
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	8.842,71	m3	24,79								4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13					
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE I PANJANG 255,56 M**																					
a.1	Pemasangan Bowsplank	715,57	m'	0,09								0,23	0,23	0,23								
a.2	Galian Tanah Drainase	733,14	m3	0,95								0,32	0,32	0,32								
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	37,05	m3	0,05								0,02	0,02	0,02								
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	18,52	m3	0,20								0,07	0,07	0,07								
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	451,57	m3	0,57								2,32	2,32	2,32								
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	93,27	m2	0,06								0,02	0,02	0,02								
B.	**TYPE II PANJANG 351,72 M**																					
b.1	Pemasangan Bowsplank	1.132,53	m'	1,09											0,55	0,55						
b.2	Galian Tanah Drainase	1.314,01	m3	1,71											0,85	0,85						
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	50,99	m3	0,07											0,03	0,04						
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	25,49	m3	0,27											0,14	0,14						
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	217,44	m3	3,51											1,76	1,76						
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	128,37	m2	0,08											0,04	0,04						
C.	**TYPE III PANJANG 220,62 M**																					
c.1	Pemasangan Bowsplank	1.058,09	m'	1,02													0,51	0,51				
c.2	Galian Tanah Drainase	2.223,89	m3	2,89													1,45	1,45				
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	39,71	m3	0,05													0,03	0,03				
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	19,85	m3	0,21													0,11	0,11				
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	765,78	m3	4,94													2,47	2,47				
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	80,52	m2	0,05													0,02	0,02				
D.	**TYPE IV PANJANG 115,12 M**																					
d.1	Pemasangan Bowsplank	713,75	m'	0,69															0,34	0,34		
d.2	Galian Tanah Drainase	2.069,88	m3	2,69															1,35	1,35		
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	76,93	m3	0,04															0,02	0,02		
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	14,96	m3	0,16															0,08	0,08		
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	192,82	m3	3,11															1,56	1,56		
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	42,01	m2	0,03															0,01	0,01		
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	1.471,00	Buah	3,64													0,91	0,91	0,91	0,91		
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	3.530,40	m	6,82													1,70	1,70	1,70	1,70		
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	88,82	m3	0,12																0,06	0,06	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	46,37	m3	0,20																0,10	0,10	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	32,30	m3	0,22																0,11	0,11	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	161,50	m2	0,06																0,03	0,03	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course, T = 6cm	21,70	Ton	0,43																0,22	0,22	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	161,50	m2	0,02																0,01	0,01	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	14,47	Ton	0,30																0,15	0,15	
B.	**PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK**																					
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	1.150,48	m2	0,17																	0,17	
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	103,08	Ton	2,11																	2,11	
				100,00																		
	RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52	3,52	10,62	10,62	10,62	11,01	7,56	11,39	7,26	6,04	6,71	3,11	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54	15,05	25,67	36,29	46,91	57,92	65,48	76,88	84,14	90,18	96,89	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92	8,56												
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01	16,58												
	DEVIASI				-0,01	-0,01	-2,50	-2,37	-0,01	5,04												

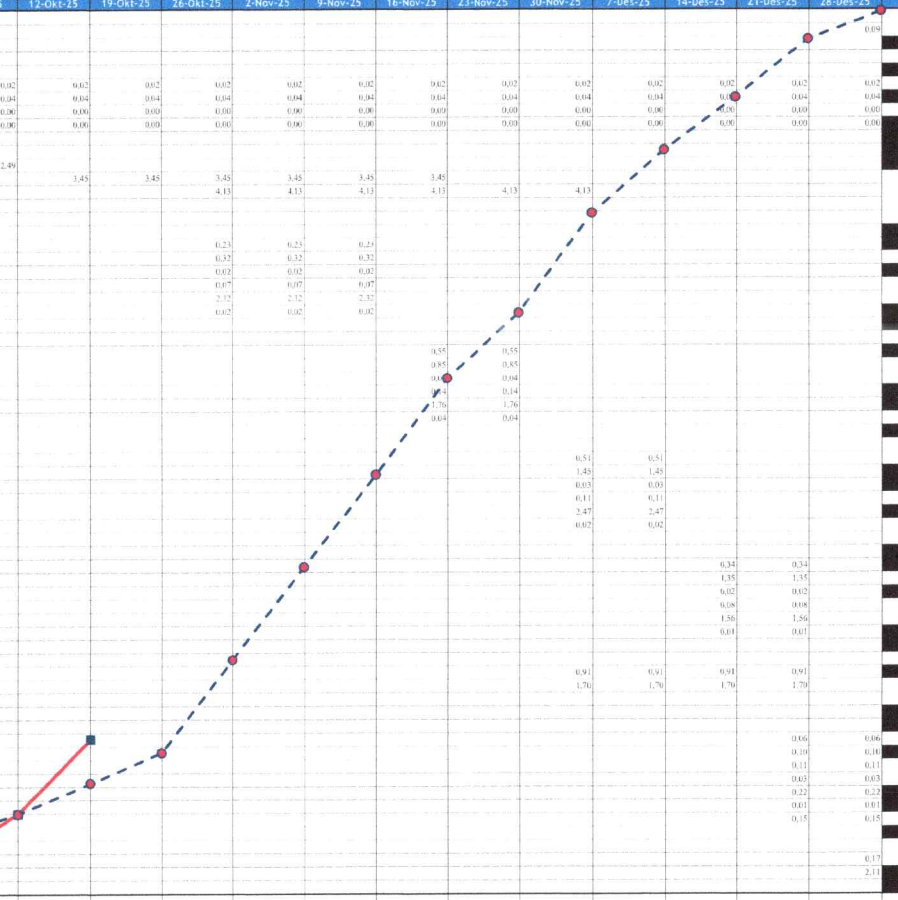

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - OKTOBER 2025

PERIODE TANGGAL : 06 Oktober 2025 s/d 12 Oktober 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Kontrak	:	RP 11.204.600.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 6 (Enam)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - OKTOBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	KONTRAK			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,28	0,64	64,10	0,18	-	-	-	0,64	64,10	0,18
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,32	0,30	29,59	0,10	0,06	5,88	0,02	0,35	35,47	0,11
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,69	0,30	29,59	0,21	0,06	5,88	0,04	0,35	35,47	0,25
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,30	29,59	0,01	0,06	5,88	0,00	0,35	35,47	0,02
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,30	29,59	0,00	0,06	5,88	0,00	0,35	35,47	0,00
	Sub Jumlah (I)			**1,39**			**0,53**			**0,06**			**0,60**
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	32.071,14	7,48	32.071,14	100,00	7,48	-	-	-	32.071,14	100,00	7,48
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	15.932,90	20,72	-	-	-	6.536,18	41,02	8,50	6.536,18	41,02	8,500
3	Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah	m3	8.842,71	24,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (II)			**52,99**			**7,48**			**8,50**			**15,98**
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE I PANJANG 255,56 M												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m'	715,57	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	733,14	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	37,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	18,52	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	431,57	6,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	93,27	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	TYPE II PANJANG 351,72 M												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.132,53	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.314,01	1,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	50,99	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	25,49	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	217,44	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	128,37	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	TYPE III PANJANG 220,62 M												
c.1	Pemasangan Bouwplank	m'	1.058,99	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.223,89	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	39,71	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	19,85	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	305,78	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	80,52	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	TYPE IV PANJANG 115,12 M												
d.1	Pemasangan Bouwplank	m'	713,75	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Galian Tanah Drainase	m3	2.069,88	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	29,93	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	14,96	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	192,82	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,01	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (III)			**31,53**			-			-			-
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	1.471,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	3.530,40	6,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (IV)			**10,46**			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	88,82	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	40,37	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	32,30	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	m2	161,50	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	21,70	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	m2	161,50	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	14,47	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	PEKERJAAN PELAPISAN JALAN DAN HALAMAN PKP-PK												
b.1	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	m2	1.150,48	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	103,08	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (V)			**3,63**			-			-			-
	JUMLAH (I s/d V)			100,00			8,01			8,56			16,58

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER
Kantor: Graha Inti Perkasa
Jl. Raden Inten II no.150 B RT.008 RW 005 Kel.Duren Sawit Jakarta Timur 13440
Telp.(021) 48873407,8625301, Email: Ptsamudraa@yahoo.co.id

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Tanggal Addendum-1	:	16 Oktober 2025
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 7 (Tujuh)
Periode Tanggal	:	13 Oktober 2025 s/d 19 Oktober 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,31	0,56	0,06	0,62
II	PEKERJAAN TANAH	78,81	15,02	9,76	24,78
III	PEKERJAAN DRAINASE	12,07	0,00	0,00	0,00
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	5,86	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	1,95	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	15,58	9,82	25,40
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				25,40
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				19,90
	3. DEVIASI				5,50

Disetujui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
Direksi Pengawas	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
MATHEOS BORU	Ir. ANDARIAS LINO PADANG	NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Penata Muda Tk. I (III/d)	Team Leader	Manager Teknik
NIP. 19801206 200212 1 005		

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 8 (Delapan)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 8															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,26	0,09	0,09															0,09	
2.	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3.	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)																					
	a. Penyiapan RK3K	1,00	Paket	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	Paket	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	Paket	0,65	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	Paket	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	Paket	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**PEKERJAAN TANAH**																					
1.	Pekerjaan Pembersihan Lahan	53.957,29	m2	11,82			2,96	2,96	2,96	2,96												
2.	Pekerjaan Galian Tanah	40.921,03	m3	30,01						3,19	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
3.	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	31.883,89	m3	7,93									0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
4.	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	118.538,62	m2	9,05									1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE II**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	506,16	m1	0,46									0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
a.2	Galian Tanah Drainase	1.840,53	m3	2,25									0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32			
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	56,29	m3	0,07									0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	28,15	m3	0,28									0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	362,81	m3	5,51									0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	1.103,77	m2	0,62									0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
a.7	Siar	706,41	m2	0,16									0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			
B.	**PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	129,20	m1	0,12											0,06	0,06						
a.2	Galian Tanah Drainase	27,08	m3	0,03											0,02	0,02						
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	6,77	m3	0,01											0,00	0,00						
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	3,39	m3	0,03											0,02	0,02						
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	107,58	m3	1,63											0,82	0,82						
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	42,32	m2	0,02											0,01	0,01						
a.7	Siar	264,70	m2	0,06											0,03	0,03						
C.	**PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING**																					
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	456,33	m3	0,66													0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
D.	**PEMBUATAN PLAT DECKER**																					
d.1	Pekerjaan Beton	1,32	m3	0,02														0,01	0,01			
d.2	Pekerjaan Pembesian	173,32	kg	0,03														0,02	0,02			
d.3	Pekerjaan Begisting	10,68	m2	0,02														0,01	0,01			
d.4	Pemasangan Bouwplank	17,76	m1	0,02														0,01	0,01			
d.5	Galian Tanah Drainase	2,52	m3	0,00														0,00	0,00			
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	0,72	m3	0,00														0,00	0,00			
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	0,36	m3	0,00														0,00	0,00			
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	3,66	m3	0,06														0,03	0,03			
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	4,50	m2	0,00														0,00	0,00			
d.10	Siar	2,83	m2	0,00														0,00	0,00			
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	853,00	Buah	1,99														0,50	0,50	0,50	0,50	
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	2.132,50	m1	3,87														0,97	0,97	0,97	0,97	
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	118,07	m3	0,14																0,07	0,07	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	53,67	m3	0,25																0,13	0,13	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	42,93	m3	0,27																0,14	0,14	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	214,67	m2	0,08																0,04	0,04	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	29,62	Ton	0,55																0,28	0,28	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	343,49	m2	0,05																0,02	0,02	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	31,60	Ton	0,61																0,30	0,30	
	RENCANA FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54												
	REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92	8,56												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01	16,58												
	RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,16	3,02	3,02	3,02	6,20	4,32	4,32	7,54	7,54	8,62	8,62	7,67	9,21	9,21	8,64	8,73	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,33	3,34	6,36	9,38	15,58	19,90	24,21	31,75	39,29	47,91	56,54	64,20	73,41	82,63	91,27	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										9,82	16,23										
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										25,40	41,63										
	DEVIASI										5,50	17,42										

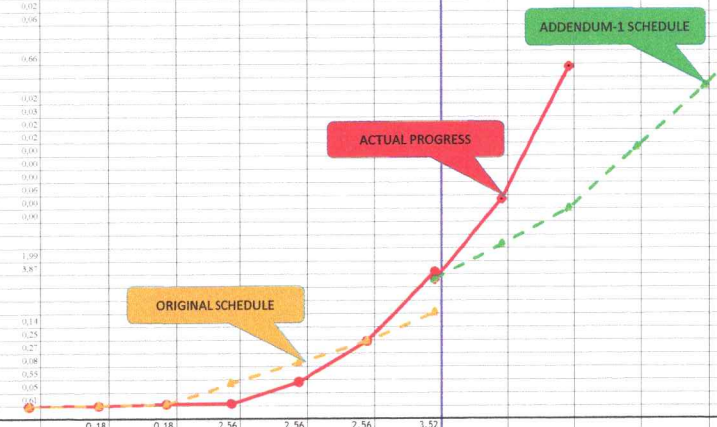

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

IR. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - OKTOBER 2025

PERIODE TANGGAL : 13 Oktober 2025 s/d 19 Oktober 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 7 (Tujuh)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - OKTOBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	ADD-1			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,26	0,64	64,10	0,17	-	-	-	0,64	64,10	0,17
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,30	0,35	35,47	0,11	0,06	5,88	0,02	0,41	41,35	0,13
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,65	0,35	35,47	0,23	0,06	5,88	0,04	0,41	41,35	0,27
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,35	35,47	0,02	0,06	5,88	0,00	0,41	41,35	0,02
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,35	35,47	0,00	0,06	5,88	0,00	0,41	41,35	0,00
		Sub Jumlah (I)		1,31			0,56			0,06			0,62
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	53.957,29	11,82	32.071,14	59,44	7,03	21.886,15	40,56	4,80	53.957,29	100,00	11,82
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	40.921,03	50,01	6.536,18	15,97	7,99	2.923,46	7,14	3,57	9.459,64	23,12	11,56
3	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	m3	31.883,89	7,93	-	-	-	5.589,54	17,53	1,39	5.589,54	17,53	1,39
4	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	m2	118.538,62	9,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (II)		78,81			15,02			9,76			24,78
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE II												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m1	506,16	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.840,53	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	56,29	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	28,15	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	362,81	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	1.103,77	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Siar	m2	706,41	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m1	129,20	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	27,08	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	6,77	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	3,39	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	107,58	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	42,32	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.7	Siar	m2	264,70	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING												
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	m3	456,33	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	PEMBUATAN PLAT DECKER												
d.1	Pekerjaan Beton	m3	1,32	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Pekerjaan Pembesian	kg	173,32	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Pekerjaan Begisting	m2	10,68	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Pemasangan Bouwplank	m1	17,76	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Galian Tanah Drainase	m3	2,52	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	0,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	3,66	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	4,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.10	Siar	m2	2,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (III)		12,07			-			-			-
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	853,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	2.132,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (IV)		5,86			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	118,07	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	53,67	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	42,93	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	214,67	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	29,62	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	343,49	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	31,60	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (V)		1,95			-			-			-
		JUMLAH (I s/d V)		100,00			15,58			9,82			25,40
		PPN 11 %											
		TOTAL											
		PEMBULATAN		100,00			15,58			9,82			25,40

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER
Kantor: Graha Inti Perkasa
Jl. Raden Inten II no.150 B RT.008 RW 005 Kel.Duren Sawit Jakarta Timur 13440
Telp.(021) 48672407,8625301, Email: ptsamudraa@yahoo.co.id

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Tanggal Addendum-1	:	16 Oktober 2025
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 8 (Delapan)
Periode Tanggal	:	20 Oktober 2025 s/d 26 Oktober 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,31	0,62	0,06	0,68
II	PEKERJAAN TANAH	78,81	24,78	15,82	40,60
III	PEKERJAAN DRAINASE	12,07	0,00	0,35	0,35
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	5,86	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	1,95	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	25,40	16,23	41,63
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				41,63
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				24,21
	3. DEVIASI				17,42

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 7 (Tujuh)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 7															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15 Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,26	0,09	0,09															0,09	
2.	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3.	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)																					
	a. Penyiapan RK3K	1,00	Paket	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	Paket	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	Paket	0,68	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	Paket	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	Paket	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**PEKERJAAN TANAH**																					
1.	Pekerjaan Pembersihan Lahan	53.957,29	m2	11,82			2,96	2,96	2,96	2,96												
2.	Pekerjaan Galian Tanah	40.921,03	m3	50,01						3,19	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
3.	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	31.883,89	m3	7,93									0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
4.	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	118.538,62	m2	9,05									1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE II**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	506,16	m1	0,46									0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
a.2	Galian Tanah Drainase	1.840,53	m3	2,25									0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32			
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	56,29	m3	0,07									0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	28,15	m3	0,28									0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	362,81	m3	3,51									0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	1.103,77	m2	0,62									0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
a.7	Siar	706,41	m2	0,16									0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			
B.	**PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	129,20	m1	0,12											0,06	0,06						
a.2	Galian Tanah Drainase	27,08	m3	0,03											0,02	0,02						
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	6,77	m3	0,01											0,00	0,00						
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	3,39	m3	0,03											0,02	0,02						
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	107,38	m3	1,03											0,82	0,82						
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	42,32	m2	0,02											0,01	0,01						
a.7	Siar	264,70	m2	0,06											0,03	0,03						
C.	**PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING**																					
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	456,33	m3	0,66											0,13	0,13	0,13	0,13	0,13			
D.	**PEMBUATAN PLAT DECKER**																					
d.1	Pekerjaan Beton	1,32	m3	0,02														0,01	0,01			
d.2	Pekerjaan Pembesian	173,32	kg	0,03														0,02	0,02			
d.3	Pekerjaan Begisting	10,68	m2	0,07														0,01	0,01			
d.4	Pemasangan Bouwplank	17,76	m1	0,02														0,00	0,00			
d.5	Galian Tanah Drainase	2,52	m3	0,00														0,00	0,00			
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	0,72	m3	0,00														0,00	0,00			
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	0,36	m3	0,00														0,00	0,00			
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	3,66	m3	0,06														0,03	0,03			
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	4,50	m2	0,00														0,00	0,00			
d.10	Siar	2,83	m2	0,00														0,00	0,00			
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	853,00	Buah	1,99														0,50	0,50	0,50	0,50	
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	2.132,50	m1	3,87														0,97	0,97	0,97	0,97	
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	118,07	m3	0,14																0,07	0,07	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	53,67	m3	0,25																0,13	0,13	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	42,93	m3	0,27																0,14	0,14	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	214,67	m2	0,08																0,04	0,04	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	29,62	Ton	0,55																0,28	0,28	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	343,49	m2	0,05																0,02	0,02	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	31,60	Ton	0,61																0,30	0,30	
	RENCANA FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54												
	REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92	8,56												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01	16,58												
	RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,16	3,02	3,02	3,02	6,20	4,32	4,32	7,54	7,54	8,62	8,62	7,67	9,21	9,21	8,64	8,73	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,33	3,34	6,36	9,38	15,58	19,90	24,21	31,75	39,29	47,91	56,54	64,20	73,41	82,63	91,27	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										9,82											
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										25,40											
	DEVIASI										5,50											

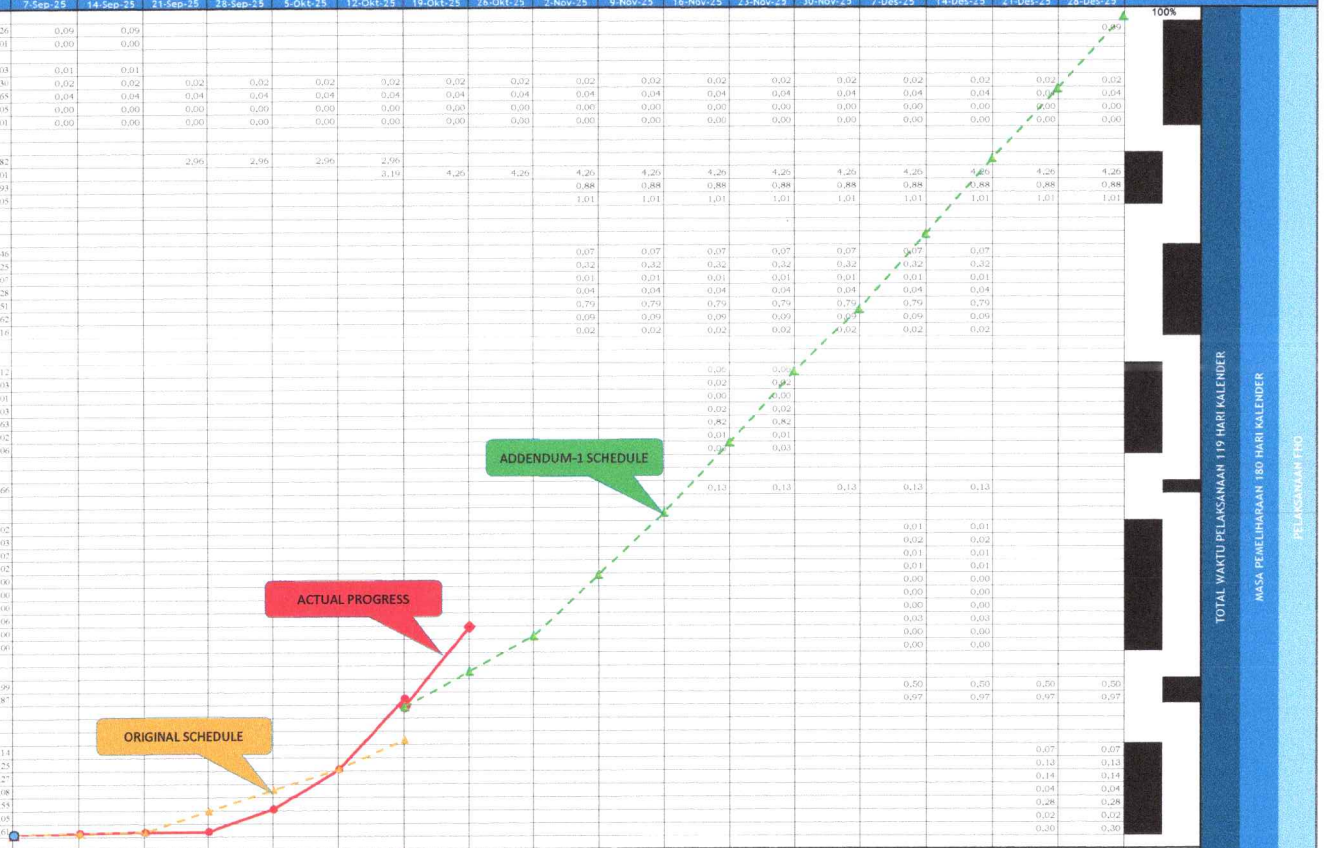

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - OKTOBER 2025

PERIODE TANGGAL : 20 Oktober 2025 s/d 26 Oktober 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 8 (Delapan)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - OKTOBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	ADD-1			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,26	0,64	64,10	0,17	-	-	-	0,64	64,10	0,17
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,30	0,41	41,35	0,13	0,06	5,88	0,02	0,47	47,24	0,14
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,65	0,41	41,35	0,27	0,06	5,88	0,04	0,47	47,24	0,31
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,41	41,35	0,02	0,06	5,88	0,00	0,47	47,24	0,02
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,41	41,35	0,00	0,06	5,88	0,00	0,47	47,24	0,00
		Sub Jumlah (I)		1,31			0,62			0,06			0,68
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	53.957,29	11,82	53.957,29	100,00	11,82	-	-	-	53.957,29	100,00	11,82
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	40.921,03	50,01	9.459,64	23,12	11,56	9.439,92	23,07	11,54	18.899,56	46,19	23,10
3	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	m3	31.883,89	7,93	5.589,54	17,53	1,39	9.371,43	29,39	2,33	14.960,97	46,92	3,72
4	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	m2	118.538,62	9,05	-	-	-	25.635,78	21,63	1,96	25.635,78	21,63	1,96
		Sub Jumlah (II)		78,81			24,78			15,82			40,60
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE II												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m1	506,16	0,46	-	-	-	26,40	5,22	0,024	26,40	5,22	0,024
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.840,53	2,25	-	-	-	66,70	3,62	0,082	66,70	3,62	0,082
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	56,29	0,07	-	-	-	2,04	3,62	0,003	2,04	3,62	0,003
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	28,15	0,28	-	-	-	1,02	3,62	0,010	1,02	3,62	0,010
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	362,81	5,51	-	-	-	13,15	3,62	0,200	13,15	3,62	0,200
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	1.103,77	0,62	-	-	-	40,00	3,62	0,023	40,00	3,62	0,023
a.7	Siar	m2	706,41	0,16	-	-	-	25,60	3,62	0,006	25,60	3,62	0,006
B.	PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m1	129,20	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	27,08	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	6,77	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	3,39	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	107,58	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,32	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.7	Siar	m2	264,70	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING												
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	m3	456,33	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	PEMBUATAN PLAT DECKER												
d.1	Pekerjaan Beton	m3	1,32	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Pekerjaan Pembesian	kg	173,32	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Pekerjaan Begisting	m2	10,68	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Pemasangan Bouwplank	m1	17,76	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Galian Tanah Drainase	m3	2,52	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	0,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	3,66	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	4,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.10	Siar	m2	2,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (III)		12,07			-			0,35			0,35
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	853,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	2.132,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (IV)		5,86			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	118,07	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	53,67	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	42,93	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	214,67	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	29,62	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	343,49	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	31,60	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (V)		1,95			-			-			-
		JUMLAH (I s/d V)		100,00			25,40			16,23			41,63
		PPN 11 %											
		TOTAL											
		PEMBULATAN		100,00			25,40			16,23			41,63

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER
Kantor: Graha Inti Perkasa
Jl. Raden Inten II no.150 B RT.008 RW 005 Kel.Duren Sawit Jakarta Timur 13440
Telp.(021) 48672407,8625361, Email: Ptsamudraa@yahoo.co.id

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Tanggal Addendum-1	:	16 Oktober 2025
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 9 (Sembilan)
Periode Tanggal	:	27 Oktober 2025 s/d 02 November 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,31	0,68	0,06	0,74
II	PEKERJAAN TANAH	78,81	40,60	2,88	43,48
III	PEKERJAAN DRAINASE	12,07	0,35	1,64	1,99
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	5,86	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	1,95	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	41,63	4,58	46,21
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				46,21
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				31,75
	3. DEVIASI				14,46

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 9 (Sembilan)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 9															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,26	0,09	0,09															0,09	
2.	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3.	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)																					
	a. Penyiapan RK3K	1,00	Paket	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	Paket	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	Paket	0,65	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	Paket	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	Paket	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**PEKERJAAN TANAH**																					
1.	Pekerjaan Pembersihan Lahan	53.957,29	m2	11,82			2,96	2,96	2,96	2,96												
2.	Pekerjaan Galian Tanah	40.921,03	m3	50,01						3,19	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
3.	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	31.883,89	m3	7,93									0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
4.	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	118.538,62	m2	9,05									1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE II**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	506,16	m1	0,46									0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
a.2	Galian Tanah Drainase	1.840,53	m3	2,23									0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32			
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	56,29	m3	0,07									0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	28,15	m3	0,28									0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	362,81	m3	5,51									0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	1.103,77	m2	0,62									0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
a.7	Siar	706,41	m2	0,16									0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			
B.	**PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	129,20	m1	0,12											0,06	0,06						
a.2	Galian Tanah Drainase	27,08	m3	0,03											0,02	0,02						
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	6,77	m3	0,01											0,00	0,00						
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	3,39	m3	0,03											0,02	0,02						
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	107,38	m3	1,63											0,82	0,82						
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	42,32	m2	0,02											0,01	0,01						
a.7	Siar	264,70	m2	0,06											0,03	0,03						
C.	**PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING**																					
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	456,33	m3	0,66											0,13	0,13	0,13	0,13	0,13			
D.	**PEMBUATAN PLAT DECKER**																					
d.1	Pekerjaan Beton	1,32	m3	0,02														0,01	0,01			
d.2	Pekerjaan Pembesian	173,32	kg	0,03														0,02	0,02			
d.3	Pekerjaan Begisting	10,68	m2	0,02														0,01	0,01			
d.4	Pemasangan Bouwplank	17,76	m1	0,02														0,01	0,01			
d.5	Galian Tanah Drainase	2,52	m3	0,00														0,00	0,00			
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	0,72	m3	0,00														0,00	0,00			
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	0,36	m3	0,00														0,00	0,00			
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	3,66	m3	0,06														0,03	0,03			
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	4,50	m2	0,00														0,00	0,00			
d.10	Siar	2,83	m2	0,00														0,00	0,00			
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	853,00	Buah	1,99														0,50	0,50	0,50	0,50	
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	2.132,50	m1	3,87														0,97	0,97	0,97	0,97	
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	118,07	m3	0,14																0,07	0,07	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	53,67	m3	0,25																0,13	0,13	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	42,93	m3	0,27																0,14	0,14	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	214,67	m2	0,08																0,04	0,04	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	29,62	Ton	0,55																0,28	0,28	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	343,49	m2	0,05																0,02	0,02	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	31,60	Ton	0,61																0,30	0,30	
	RENCANA FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54												
	REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92	8,56												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01	16,58												
	RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,16	3,02	3,02	3,02	6,20	4,32	4,32	7,54	7,54	8,62	8,62	7,67	9,21	9,21	8,64	8,73	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,33	3,34	6,36	9,38	15,58	19,90	24,21	31,75	39,29	47,91	56,54	64,20	73,41	82,63	91,27	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										9,82	16,23	4,58									
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										25,40	41,63	46,21									
	DEVIASI										5,50	17,42	14,46									

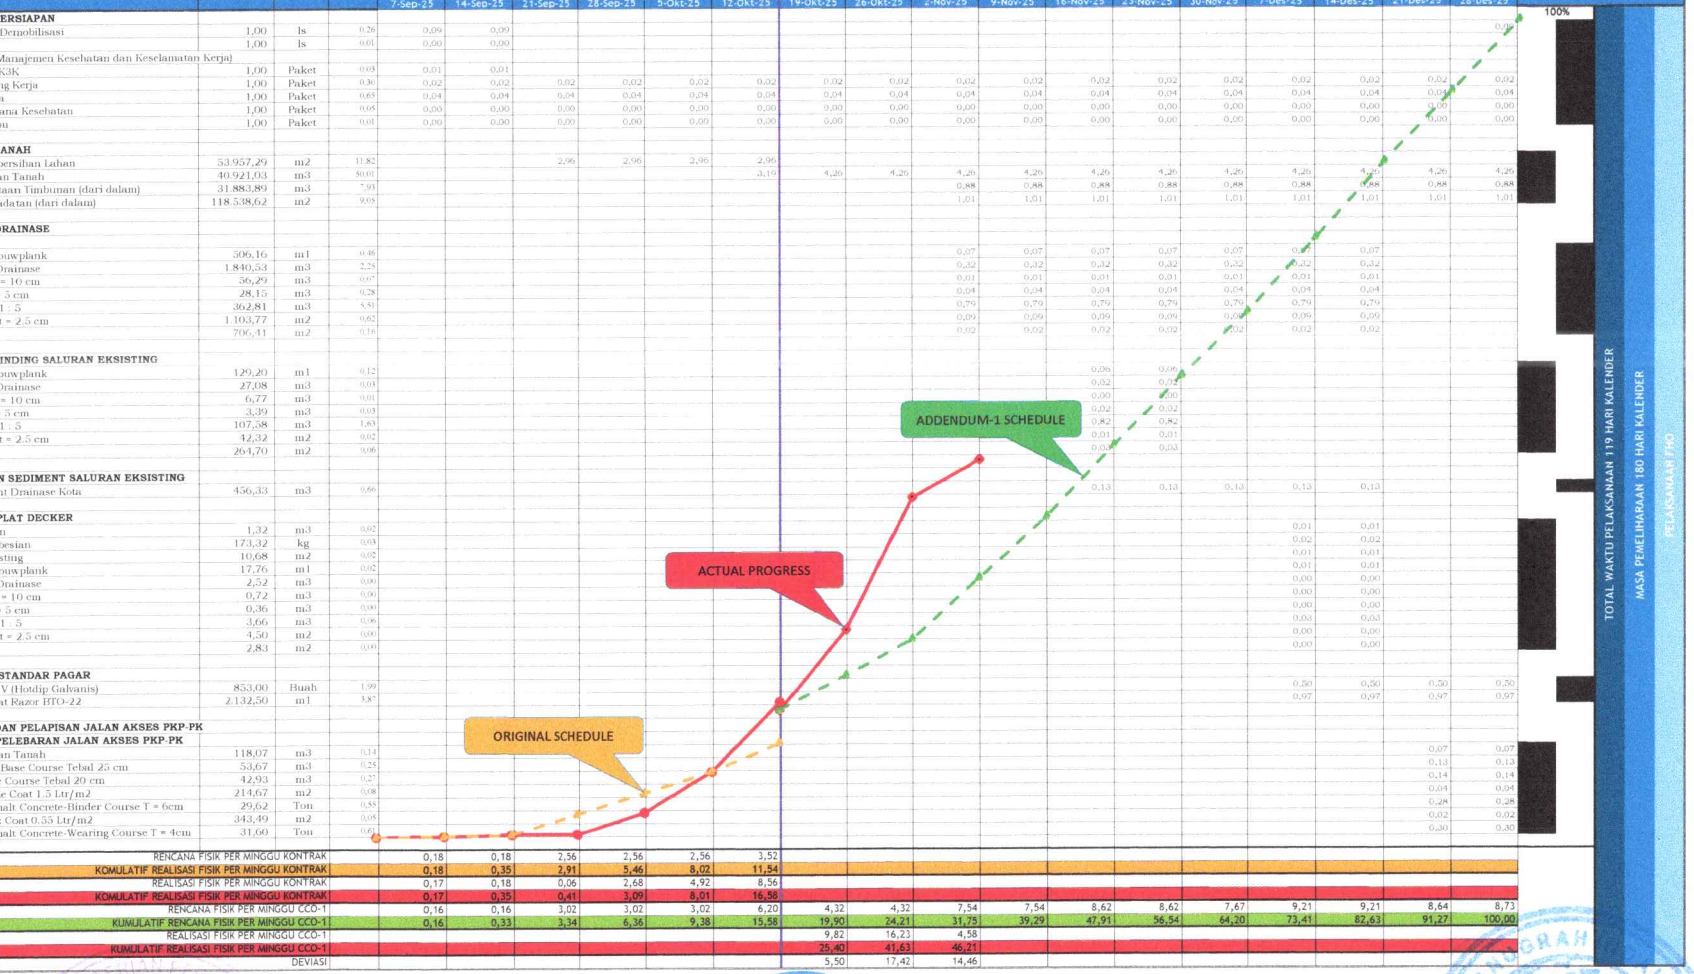

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LIMO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 27 Oktober 2025 s/d 02 November 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 9 (Sembilan)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	ADD-1			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,26	0,64	64,10	0,17	-	-	-	0,64	64,10	0,17
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,30	0,47	47,24	0,14	0,06	5,88	0,02	0,53	53,12	0,16
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,65	0,47	47,24	0,31	0,06	5,88	0,04	0,53	53,12	0,35
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,47	47,24	0,02	0,06	5,88	0,00	0,53	53,12	0,02
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,47	47,24	0,00	0,06	5,88	0,00	0,53	53,12	0,00
	Sub Jumlah (I)			**1,31**			**0,68**			**0,06**			**0,74**
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	53.957,29	11,82	53.957,29	100,00	11,82	-	-	-	53.957,29	100,00	11,82
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	40.921,03	50,01	18.899,56	46,19	23,10	1.223,25	2,99	1,50	20.122,81	49,17	24,59
3	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	m3	31.883,89	7,93	14.960,97	46,92	3,72	1.433,91	4,50	0,36	16.394,88	51,42	4,08
4	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	m2	118.538,62	9,05	25.635,78	21,63	1,96	13.477,12	11,37	1,03	39.112,89	33,00	2,99
	Sub Jumlah (II)			**78,81**			**40,60**			**2,88**			**43,48**
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE II												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m1	506,16	0,46	26,40	5,22	0,02	44,64	8,82	0,040	71,04	14,04	0,064
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.840,53	2,25	66,70	3,62	0,08	229,71	12,48	0,281	296,41	16,10	0,362
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	56,29	0,07	2,04	3,62	0,00	7,03	12,48	0,009	9,07	16,10	0,012
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	28,15	0,28	1,02	3,62	0,01	3,51	12,48	0,035	4,53	16,10	0,046
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	362,81	5,51	13,15	3,62	0,20	45,28	12,48	0,687	58,43	16,11	0,887
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	1.103,77	0,62	40,00	3,62	0,02	137,76	12,48	0,078	177,76	16,10	0,100
a.7	Siar	m2	706,41	0,16	25,60	3,62	0,01	88,17	12,48	0,020	113,77	16,10	0,026
B.	PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m1	129,20	0,12	-	-	-	30,00	23,22	0,027	30,00	23,22	0,027
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	27,08	0,03	-	-	-	6,78	25,04	0,008	6,78	25,04	0,008
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	6,77	0,01	-	-	-	1,70	25,04	0,002	1,70	25,04	0,002
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	3,39	0,03	-	-	-	0,85	25,04	0,009	0,85	25,04	0,009
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	107,58	1,63	-	-	-	28,82	26,79	0,437	28,82	26,79	0,437
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,32	0,02	-	-	-	11,87	28,04	0,007	11,87	28,04	0,007
b.7	Siar	m2	264,70	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING												
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	m3	456,33	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	PEMBUATAN PLAT DECKER												
d.1	Pekerjaan Beton	m3	1,32	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Pekerjaan Pembesian	kg	173,32	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Pekerjaan Begisting	m2	10,68	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Pemasangan Bouwplank	m1	17,76	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Galian Tanah Drainase	m3	2,52	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	0,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	3,66	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	4,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.10	Siar	m2	2,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (III)			**12,07**			**0,35**			**1,64**			**1,99**
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	853,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	2.132,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (IV)			**5,86**			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	118,07	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	53,67	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	42,93	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	214,67	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	29,62	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	343,49	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	31,60	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (V)			**1,95**			-			-			-
	JUMLAH (I s/d V)			100,00			41,63			4,58			46,21
	PPN 11 %												
	TOTAL												
	PEMBULATAN			100,00			41,63			4,58			46,21

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER
Kantor: Graha Inti Perkasa
Jl. Raden Inten II no.150 B RT.008 RW 005 Kel.Duren Sawit Jakarta Timur 13440
Telp.(021) 48672407, 8625301, Email: Ptsamudraa@yahoo.co.id

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Tanggal Addendum-1	:	16 Oktober 2025
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 10 (Sepuluh)
Periode Tanggal	:	03 November 2025 s/d 09 November 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,31	0,74	0,06	0,80
II	PEKERJAAN TANAH	78,81	43,48	0,00	43,48
III	PEKERJAAN DRAINASE	12,07	1,99	3,76	5,75
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	5,86	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	1,95	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	46,21	3,82	50,03
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				50,03
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				39,29
	3. DEVIASI				10,74

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 10 (Sepuluh)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 10															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,26	0,09	0,09															0,08	
2.	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3.	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)																					
	a. Penyiapan RK3K	1,00	Paket	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	Paket	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil kerja	1,00	Paket	0,65	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	Paket	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	Paket	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**PEKERJAAN TANAH**																					
1.	Pekerjaan Pembersihan Lahan	53.957,29	m2	11,82			2,96	2,96	2,96	2,96												
2.	Pekerjaan Galian Tanah	40.921,03	m3	50,01						3,19	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
3.	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	31.883,89	m3	7,93									0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
4.	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	118.538,62	m2	9,05									1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE II**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	506,16	m1	0,46									0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
a.2	Galian Tanah Drainase	1.840,53	m3	2,24									0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32			
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	56,29	m3	0,07									0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	28,15	m3	0,28									0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	362,81	m3	5,51									0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	1.103,77	m2	0,62									0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
a.7	Siar	706,41	m2	0,16									0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			
B.	**PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	129,20	m1	0,12											0,02	0,02						
a.2	Galian Tanah Drainase	27,08	m3	0,03											0,00	0,00						
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	6,77	m3	0,01											0,02	0,02						
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	3,39	m3	0,03											0,82	0,82						
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	107,58	m3	1,63											0,01	0,01						
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	42,32	m2	0,02											0,03	0,03						
a.7	Siar	264,70	m2	0,06																		
C.	**PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING**																					
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	456,33	m3	0,66											0,13	0,13	0,13	0,13	0,13			
D.	**PEMBUATAN PLAT DECKER**																					
d.1	Pekerjaan Beton	1,32	m3	0,02														0,01	0,01			
d.2	Pekerjaan Pembesian	173,32	kg	0,03														0,02	0,02			
d.3	Pekerjaan Begisting	10,68	m2	0,02														0,01	0,01			
d.4	Pemasangan Bouwplank	17,76	m1	0,02														0,01	0,01			
d.5	Galian Tanah Drainase	2,52	m3	0,00														0,00	0,00			
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	0,72	m3	0,00														0,00	0,00			
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	0,36	m3	0,00														0,00	0,00			
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	3,66	m3	0,06														0,00	0,00			
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	4,50	m2	0,00														0,03	0,03			
d.10	Siar	2,83	m2	0,00														0,00	0,00			
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	853,00	Buah	1,99														0,50	0,50	0,50	0,50	
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	2.132,50	m1	3,81														0,97	0,97	0,97	0,97	
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	118,07	m3	0,14																0,07	0,07	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	53,67	m3	0,25																0,13	0,13	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	42,93	m3	0,27																0,14	0,14	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	214,67	m2	0,08																0,04	0,04	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	29,62	Ton	0,55																0,28	0,28	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	343,49	m2	0,05																0,02	0,02	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	31,60	Ton	0,60																0,30	0,30	
	RENCANA FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54												
	REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92	8,56												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01	16,58												
	RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,16	3,02	3,02	3,02	6,20	4,32	4,32	7,54	7,54	8,62	8,62	7,67	9,21	9,21	8,64	8,73	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,33	3,34	6,36	9,38	15,58	19,90	24,21	31,75	39,29	47,91	56,54	64,20	73,41	82,63	91,27	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										9,82	16,23	4,58	3,82								
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										25,40	41,63	46,21	50,03								
	DEVIASI										5,50	17,42	14,46	10,75								

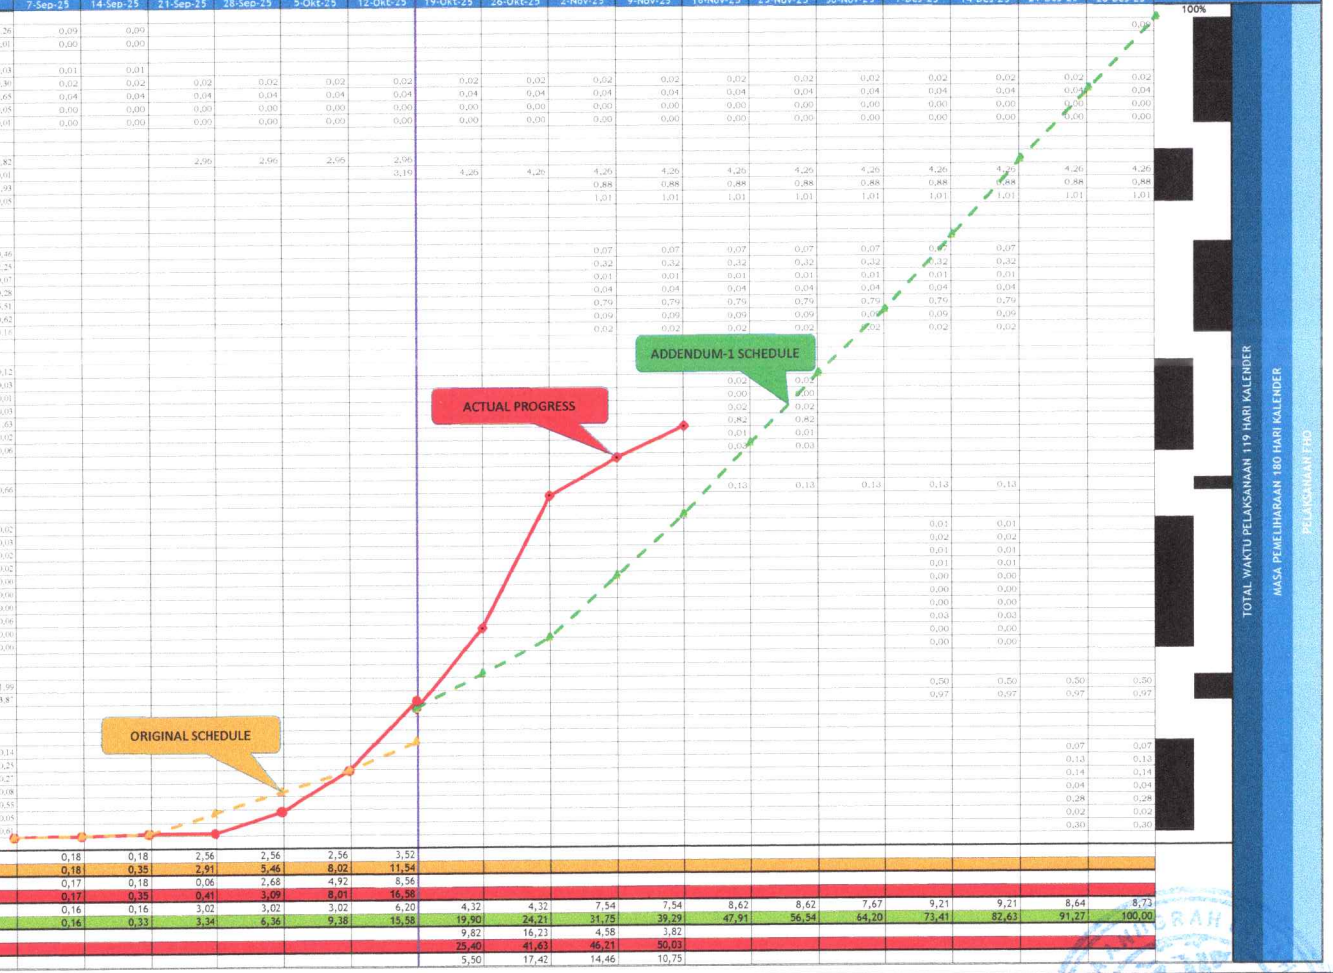

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 03 November 2025 s/d 09 November 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 10 (Sepuluh)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	ADD-1			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,26	0,64	64,10	0,17	-	-	-	0,64	64,10	0,17
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,30	0,53	53,12	0,16	0,06	5,88	0,02	0,59	59,00	0,18
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,65	0,53	53,12	0,35	0,06	5,88	0,04	0,59	59,00	0,38
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,53	53,12	0,02	0,06	5,88	0,00	0,59	59,00	0,03
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,53	53,12	0,00	0,06	5,88	0,00	0,59	59,00	0,00
		Sub Jumlah (I)		1,31			0,74			0,06			0,80
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	53.957,29	11,82	53.957,29	100,00	11,82	-	-	-	53.957,29	100,00	11,82
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	40.921,03	50,01	20.122,81	49,17	24,59	-	-	-	20.122,81	49,17	24,59
3	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	m3	31.883,89	7,93	16.394,88	51,42	4,08	-	-	-	16.394,88	51,42	4,08
4	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	m2	118.538,62	9,05	39.112,89	33,00	2,99	-	-	-	39.112,89	33,00	2,99
		Sub Jumlah (II)		78,81			43,48			-			43,48
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE II												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m1	506,16	0,46	71,04	14,04	0,06	177,60	35,09	0,161	248,64	49,12	0,225
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.840,53	2,25	296,41	16,10	0,36	606,97	32,98	0,742	903,38	49,08	1,104
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	56,29	0,07	9,07	16,10	0,01	18,56	32,98	0,024	27,63	49,08	0,036
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	28,15	0,28	4,53	16,10	0,05	9,28	32,98	0,093	13,81	49,08	0,139
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	362,81	5,51	58,43	16,11	0,89	119,65	32,98	1,816	178,08	49,08	2,702
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	1.103,77	0,62	177,76	16,10	0,10	364,00	32,98	0,205	541,76	49,08	0,305
a.7	Siar	m2	706,41	0,16	113,77	16,10	0,03	232,96	32,98	0,053	346,73	49,08	0,079
B.	PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m1	129,20	0,12	30,00	23,22	0,03	-	-	-	30,00	23,22	0,027
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	27,08	0,03	6,78	25,04	0,01	-	-	-	6,78	25,04	0,008
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	6,77	0,01	1,70	25,04	0,00	-	-	-	1,70	25,04	0,002
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	3,39	0,03	0,85	25,04	0,01	-	-	-	0,85	25,04	0,009
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	107,58	1,63	28,82	26,79	0,44	-	-	-	28,82	26,79	0,437
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,32	0,02	11,87	28,04	0,01	-	-	-	11,87	28,04	0,007
b.7	Siar	m2	264,70	0,06	-	-	-	67,80	25,61	0,015	67,80	25,61	0,015
C.	PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING												
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	m3	456,33	0,66	-	-	-	456,33	100,00	0,656	456,33	100,00	0,656
D.	PEMBUATAN PLAT DECKER												
d.1	Pekerjaan Beton	m3	1,32	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Pekerjaan Pembesian	kg	173,32	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Pekerjaan Begisting	m2	10,68	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Pemasangan Bouwplank	m1	17,76	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Galian Tanah Drainase	m3	2,52	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	0,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	3,66	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	4,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.10	Siar	m2	2,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (III)		12,07			1,99			3,76			5,75
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	853,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	2.132,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (IV)		5,86			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	118,07	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	53,67	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	42,93	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	214,67	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	29,62	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	343,49	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	31,60	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (V)		1,95			-			-			-
		JUMLAH (I s/d V)		100,00			46,21			3,82			50,03
		PPN 11 %											
		TOTAL											
		PEMBULATAN		100,00			46,21			3,82			50,03

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER
Kantor: Graha Inti Perkasa
Jl. Raden Inten II no.150 B RT.008 RW 005 Kel.Duren Sawit Jakarta Timur 13440
Telp.(021) 48673407,8625361, Email: Ptsamudraa@yahoo.co.id

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Tanggal Addendum-1	:	16 Oktober 2025
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 11 (Sebelas)
Periode Tanggal	:	10 November 2025 s/d 16 November 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,31	0,80	0,06	0,86
II	PEKERJAAN TANAH	78,81	43,48	7,56	51,04
III	PEKERJAAN DRAINASE	12,07	5,75	2,88	8,63
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	5,86	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	1,95	0,00	0,00	0,00
A.	TOTAL BIAYA	100,00	50,03	10,49	60,52
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				60,52
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				47,91
	3. DEVIASI				12,61

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 11 (Sebelas)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 11															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,26	0,09	0,09															0,09	
2.	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3.	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)																					
	a. Penyiapan RKK	1,00	Paket	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	Paket	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	Paket	0,65	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	Paket	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	Paket	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**PEKERJAAN TANAH**																					
1.	Pekerjaan Pembersihan Lahan	53.957,29	m2	11,82			2,96	2,96	2,96	2,96												
2.	Pekerjaan Galian Tanah	40.921,03	m3	50,01						3,19	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
3.	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	31.883,89	m3	7,93									0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
4.	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	118.538,62	m2	9,65									1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE II**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	506,16	m1	0,46									0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
a.2	Galian Tanah Drainase	1.840,53	m3	2,25									0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32			
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	36,29	m3	0,07									0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	28,15	m3	0,28									0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	362,81	m3	5,51									0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	1.103,77	m2	0,62									0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
a.7	Siar	706,41	m2	0,16									0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			
B.	**PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	129,20	m1	0,12											0,06	0,06						
a.2	Galian Tanah Drainase	27,08	m3	0,03											0,02	0,02						
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	6,77	m3	0,01											0,00	0,00						
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	3,39	m3	0,03											0,02	0,02						
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	107,58	m3	1,63											0,82	0,82						
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	42,32	m2	0,02											0,01	0,01						
a.7	Siar	264,70	m2	0,06											0,03	0,03						
C.	**PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING**																					
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	456,33	m3	0,66											0,13	0,13	0,13	0,13	0,13			
D.	**PEMBUATAN PLAT DECKER**																					
d.1	Pekerjaan Beton	1,32	m3	0,02														0,01	0,01			
d.2	Pekerjaan Pembesian	173,32	kg	0,03														0,02	0,02			
d.3	Pekerjaan Begisting	10,68	m2	0,02														0,01	0,01			
d.4	Pemasangan Bouwplank	17,76	m1	0,02														0,01	0,01			
d.5	Galian Tanah Drainase	2,52	m3	0,00														0,00	0,00			
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	0,72	m3	0,00														0,00	0,00			
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	0,36	m3	0,00														0,00	0,00			
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	3,66	m3	0,06														0,03	0,03			
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	4,50	m2	0,00														0,00	0,00			
d.10	Siar	2,83	m2	0,00														0,00	0,00			
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	853,00	Buah	1,99														0,50	0,50	0,50	0,50	
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	2.132,50	m1	3,81														0,97	0,97	0,97	0,97	
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	118,07	m3	0,14																0,07	0,07	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	53,67	m3	0,25																0,13	0,13	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	42,93	m3	0,27																0,14	0,14	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	214,67	m2	0,08																0,04	0,04	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	29,62	Ton	0,55																0,28	0,28	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	343,49	m2	0,05																0,02	0,02	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	31,60	Ton	0,61																0,30	0,30	
	RENCANA FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54												
	REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92	8,56												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01	16,58												
	RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,16	3,02	3,02	3,02	6,20	4,32	4,32	7,54	7,54	8,62	8,62	7,67	9,21	9,21	8,64	8,73	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,33	3,34	6,36	9,38	15,58	19,90	24,21	31,75	39,29	47,91	56,54	64,20	73,41	82,63	91,27	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										9,82	16,23	4,58	3,82	10,49							
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										25,40	41,63	46,21	50,03	60,52							
	DEVIASI										5,50	17,42	14,46	10,74	12,61							

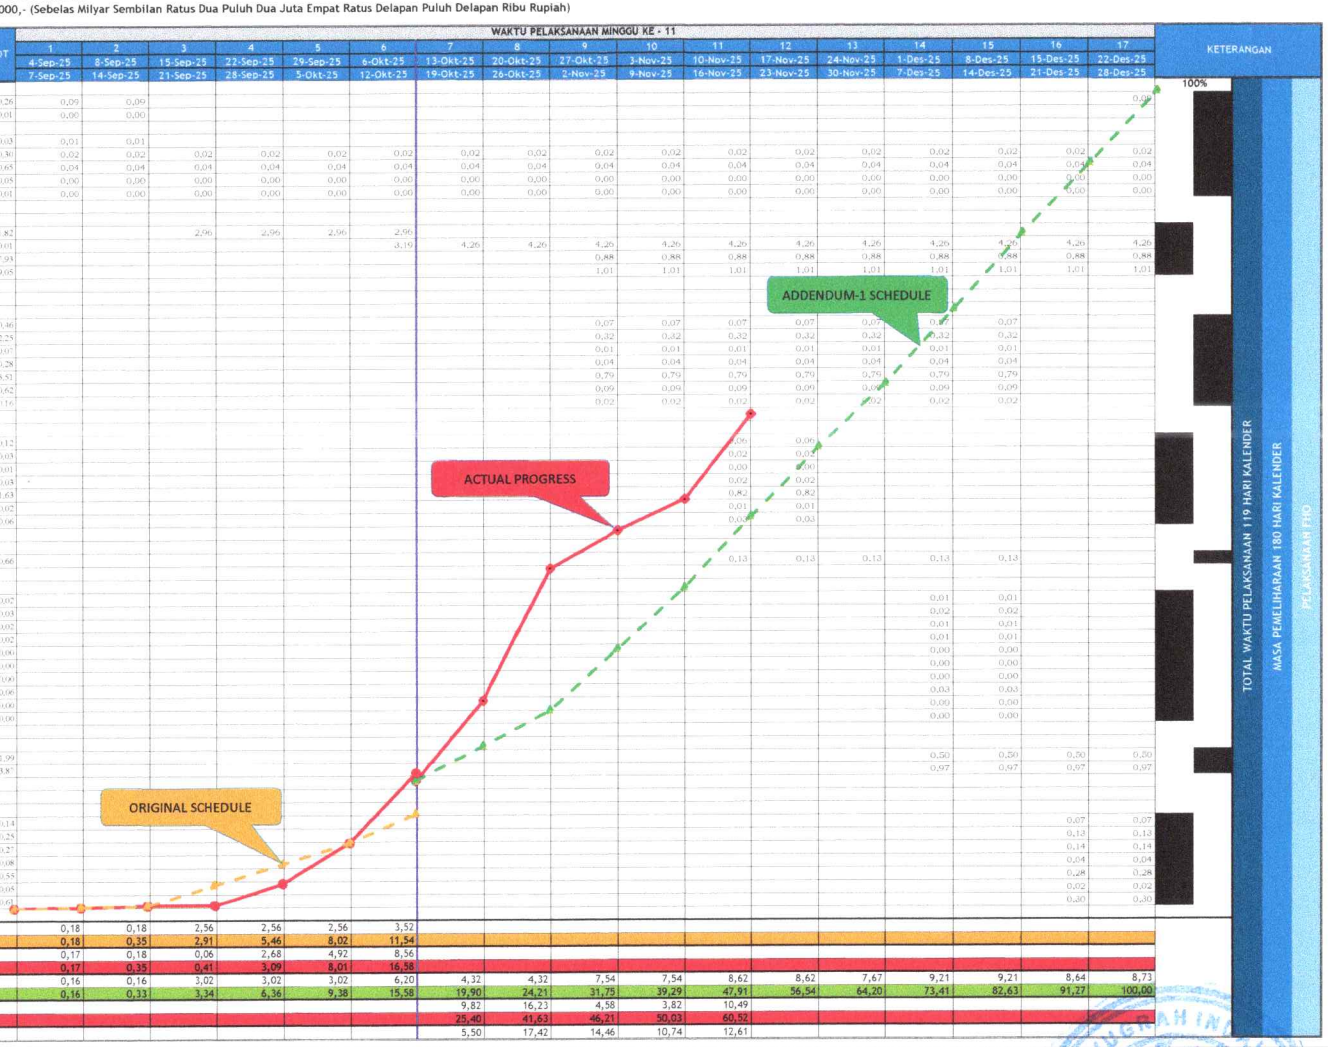

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 10 November 2025 s/d 16 November 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 11 (Sebelas)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	ADD-1			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,26	0,64	64,10	0,17	-	-	-	0,64	64,10	0,17
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,30	0,59	59,00	0,18	0,06	5,88	0,02	0,65	64,88	0,20
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,65	0,59	59,00	0,38	0,06	5,88	0,04	0,65	64,88	0,42
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,59	59,00	0,03	0,06	5,88	0,00	0,65	64,88	0,03
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,59	59,00	0,00	0,06	5,88	0,00	0,65	64,88	0,01
		Sub Jumlah (I)		1,31			0,80			0,06			0,86
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	53.957,29	11,82	53.957,29	100,00	11,82	-	-	-	53.957,29	100,00	11,82
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	40.921,03	50,01	20.122,81	49,17	24,59	4.404,48	10,76	5,38	24.527,28	59,94	29,98
3	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	m3	31.883,89	7,93	16.394,88	51,42	4,08	3.443,07	10,80	0,86	19.837,95	62,22	4,93
4	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	m2	118.538,62	9,05	39.112,89	33,00	2,99	17.253,65	14,56	1,32	56.366,54	47,55	4,30
		Sub Jumlah (II)		78,81			43,48			7,56			51,04
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE II												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m1	506,16	0,46	248,64	49,12	0,23	150,96	29,82	0,137	399,60	78,95	0,362
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.840,53	2,25	903,38	49,08	1,10	567,23	30,82	0,693	1.470,61	79,90	1,797
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	56,29	0,07	27,63	49,08	0,04	17,35	30,82	0,022	44,98	79,90	0,058
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	28,15	0,28	13,81	49,08	0,14	8,67	30,82	0,087	22,49	79,90	0,226
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	362,81	5,51	178,08	49,08	2,70	111,81	30,82	1,697	289,89	79,90	4,399
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	1.103,77	0,62	541,76	49,08	0,30	340,17	30,82	0,191	881,93	79,90	0,496
a.7	Siar	m2	706,41	0,16	346,73	49,08	0,08	217,71	30,82	0,049	564,43	79,90	0,128
B.	PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m1	129,20	0,12	30,00	23,22	0,03	-	-	-	30,00	23,22	0,027
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	27,08	0,03	6,78	25,04	0,01	-	-	-	6,78	25,04	0,008
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	6,77	0,01	1,70	25,04	0,00	-	-	-	1,70	25,04	0,002
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	3,39	0,03	0,85	25,04	0,01	-	-	-	0,85	25,04	0,009
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	107,58	1,63	28,82	26,79	0,44	-	-	-	28,82	26,79	0,437
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	42,32	0,02	11,87	28,04	0,01	-	-	-	11,87	28,04	0,007
b.7	Siar	m2	264,70	0,06	67,80	25,61	0,02	-	-	-	67,80	25,61	0,015
C.	PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING												
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	m3	456,33	0,66	456,33	100,00	0,66	-	-	-	456,33	100,00	0,656
D.	PEMBUATAN PLAT DECKER												
d.1	Pekerjaan Beton	m3	1,32	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Pekerjaan Pembesian	kg	173,32	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Pekerjaan Begisting	m2	10,68	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Pemasangan Bouwplank	m1	17,76	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Galian Tanah Drainase	m3	2,52	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	0,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	3,66	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	4,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.10	Siar	m2	2,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (III)		12,07			5,75			2,88			8,63
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	853,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	2.132,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (IV)		5,86			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	118,07	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	53,67	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	42,93	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	214,67	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	29,62	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	343,49	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	31,60	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (V)		1,95			-			-			-
		JUMLAH (I s/d V)		100,00			50,03			10,49			60,52
		PPN 11 %											
		TOTAL											
		PEMBULATAN		100,00			50,03			10,49			60,52

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER
Kantor: Graha Inti Perkasa
Jl. Raden Inten II no.150 B RT.008 RW 005 Kel.Duren Sawit Jakarta Timur 13440
Telp.(021) 48673407, 8625361, Email: Pteamudra@yahoo.co.id

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Tanggal Addendum-1	:	16 Oktober 2025
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 12 (Dua Belas)
Periode Tanggal	:	17 November 2025 s/d 23 November 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,31	0,86	0,06	0,92
II	PEKERJAAN TANAH	78,81	51,04	18,75	69,78
III	PEKERJAAN DRAINASE	12,07	8,63	0,85	9,47
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	5,86	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	1,95	0,00	0,33	0,33
A.	TOTAL BIAYA	100,00	60,52	19,99	80,51
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				80,51
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				56,54
	3. DEVIASI				23,98

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 12 (Dua Belas)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 12															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,26	0,09	0,09															0,09	
2.	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3.	SMKJ (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)																					
	a. Penyiapan RK3K	1,00	Paket	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	Paket	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	Paket	0,65	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	Paket	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	Paket	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**PEKERJAAN TANAH**																					
1.	Pekerjaan Pembersihan Lahan	53.957,29	m2	11,82			2,96	2,96	2,96	2,96												
2.	Pekerjaan Galian Tanah	40.921,03	m3	30,01						3,19	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
3.	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	31.883,89	m3	7,93									0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
4.	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	118.538,62	m2	9,05									1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE II**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	506,16	m1	0,46									0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
a.2	Galian Tanah Drainase	1.840,53	m3	2,25									0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32			
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	56,29	m3	0,07									0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	28,15	m3	0,28									0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	362,81	m3	3,51									0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	1.103,77	m2	0,62									0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
a.7	Siar	706,41	m2	0,16									0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			
B.	**PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	129,20	m1	0,12											0,06	0,06						
a.2	Galian Tanah Drainase	27,08	m3	0,03											0,02	0,02						
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	6,77	m3	0,01											0,00	0,00						
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	3,39	m3	0,03											0,02	0,02						
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	107,58	m3	1,03											0,82	0,82						
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	42,32	m2	0,02											0,01	0,01						
a.7	Siar	264,70	m2	0,06											0,03	0,03						
C.	**PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING**																					
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	456,33	m3	0,66													0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
D.	**PEMBUATAN PLAT DECKER**																					
d.1	Pekerjaan Beton	1,32	m3	0,02														0,01	0,01			
d.2	Pekerjaan Pembesian	173,32	kg	0,03														0,02	0,02			
d.3	Pekerjaan Begisting	10,68	m2	0,02														0,01	0,01			
d.4	Pemasangan Bouwplank	17,76	m1	0,02														0,01	0,01			
d.5	Galian Tanah Drainase	2,52	m3	0,00														0,00	0,00			
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	0,72	m3	0,00														0,00	0,00			
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	0,36	m3	0,00														0,00	0,00			
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	3,66	m3	0,06														0,03	0,03			
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	4,50	m2	0,00														0,00	0,00			
d.10	Siar	2,83	m2	0,00														0,00	0,00			
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	853,00	Buah	1,99														0,50	0,50	0,50	0,50	
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	2.132,50	m1	3,87														0,97	0,97	0,97	0,97	
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	118,07	m3	0,14																0,07	0,07	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	53,67	m3	0,25																0,13	0,13	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	42,93	m3	0,27																0,14	0,14	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	214,67	m2	0,08																0,04	0,04	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	29,62	Ton	0,55																0,28	0,28	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	343,49	m2	0,05																0,02	0,02	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	31,60	Ton	0,61																0,30	0,30	
	RENCANA FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54												
	REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92	8,56												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01	16,58												
	RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,16	3,02	3,02	3,02	6,20	4,32	4,32	7,54	7,54	8,62	8,62	7,67	9,21	9,21	8,64	8,73	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,33	3,34	6,36	9,38	15,58	19,90	24,21	31,75	39,29	47,91	56,54	64,20	73,41	82,63	91,27	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										9,82	16,23	4,58	3,82	10,49	19,99						
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										25,40	41,63	46,21	50,03	60,52	80,51						
	DEVIASI										5,50	17,42	14,46	10,74	12,61	23,97						

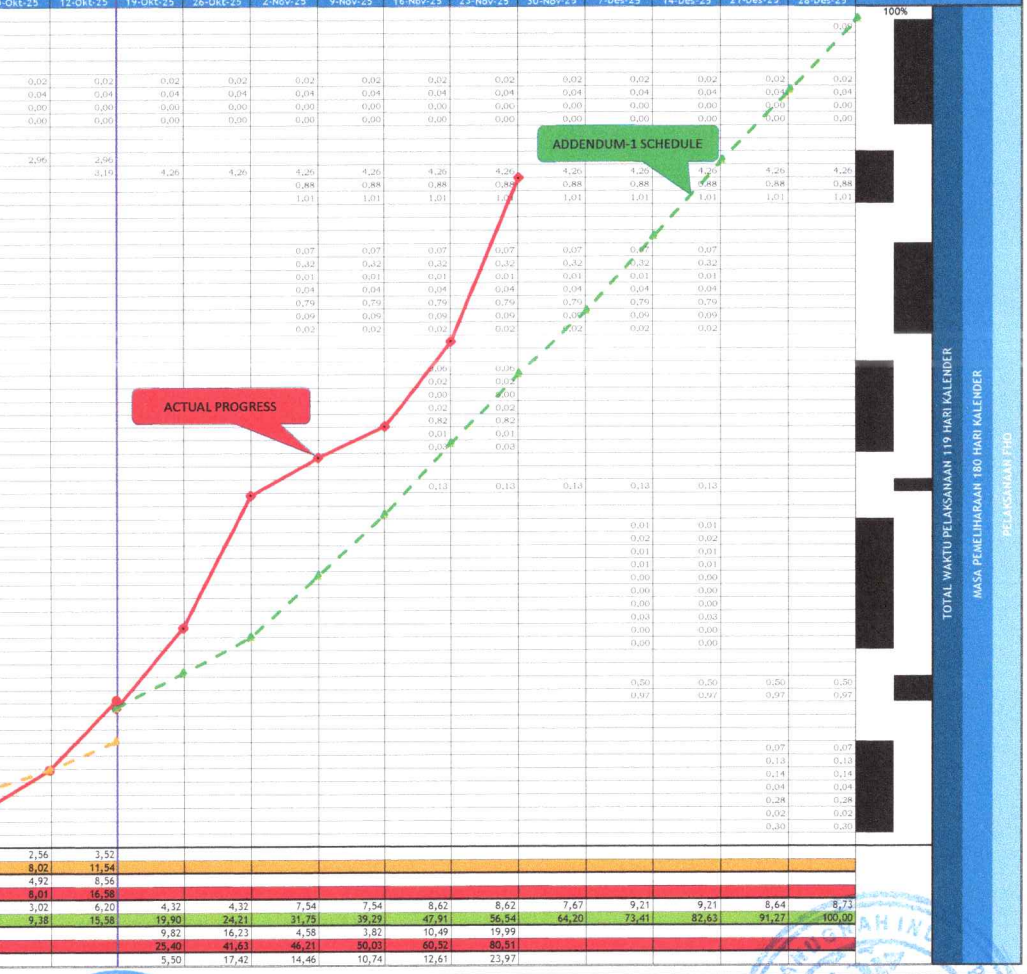

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

ALEXANDRIAS LINO BADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 17 November 2025 s/d 23 November 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 12 (Dua Belas)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	ADD-1			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,26	0,64	64,10	0,17	-	-	-	0,64	64,10	0,17
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,30	0,65	64,88	0,20	0,06	5,88	0,02	0,71	70,77	0,21
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,65	0,65	64,88	0,42	0,06	5,88	0,04	0,71	70,77	0,46
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,65	64,88	0,03	0,06	5,88	0,00	0,71	70,77	0,03
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,65	64,88	0,01	0,06	5,88	0,00	0,71	70,77	0,01
	Sub Jumlah (I)			1,31			0,86			0,06			0,92
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	53.957,29	11,82	53.957,29	100,00	11,82	-	-	-	53.957,29	100,00	11,82
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	40.921,03	50,01	24.527,28	59,94	29,98	11.061,75	27,03	13,52	35.589,03	86,97	43,50
3	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	m3	31.883,89	7,93	19.837,95	62,22	4,93	8.235,61	25,83	2,05	28.073,56	88,05	6,98
4	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	m2	118.538,62	9,05	56.366,54	47,55	4,30	41.678,68	35,16	3,18	98.045,23	82,71	7,48
	Sub Jumlah (II)			78,81			51,04			18,75			69,78
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE II												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m1	506,16	0,46	399,60	78,95	0,36	44,40	8,77	0,040	444,00	87,72	0,402
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.840,53	2,25	1.470,61	79,90	1,80	166,75	9,06	0,204	1.637,36	88,96	2,001
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	56,29	0,07	44,98	79,90	0,06	5,10	9,06	0,007	50,08	88,96	0,065
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	28,15	0,28	22,49	79,90	0,23	2,55	9,06	0,026	25,04	88,96	0,251
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	362,81	5,51	289,89	79,90	4,40	32,87	9,06	0,499	322,76	88,96	4,898
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	1.103,77	0,62	881,93	79,90	0,50	100,00	9,06	0,056	981,93	88,96	0,553
a.7	Siar	m2	706,41	0,16	564,43	79,90	0,13	64,00	9,06	0,015	628,43	88,96	0,142
B.	PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m1	129,20	0,12	30,00	23,22	0,03	-	-	-	30,00	23,22	0,027
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	27,08	0,03	6,78	25,04	0,01	-	-	-	6,78	25,04	0,008
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	6,77	0,01	1,70	25,04	0,00	-	-	-	1,70	25,04	0,002
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	3,39	0,03	0,85	25,04	0,01	-	-	-	0,85	25,04	0,009
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	107,58	1,63	28,82	26,79	0,44	-	-	-	28,82	26,79	0,437
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	42,32	0,02	11,87	28,04	0,01	-	-	-	11,87	28,04	0,007
b.7	Siar	m2	264,70	0,06	67,80	25,61	0,02	-	-	-	67,80	25,61	0,015
C.	PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING												
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	m3	456,33	0,66	456,33	100,00	0,66	-	-	-	456,33	100,00	0,656
D.	PEMBUATAN PLAT DECKER												
d.1	Pekerjaan Beton	m3	1,32	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.2	Pekerjaan Pembesian	kg	173,32	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.3	Pekerjaan Begisting	m2	10,68	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.4	Pemasangan Bouwplank	m1	17,76	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.5	Galian Tanah Drainase	m3	2,52	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	0,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	3,66	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	4,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.10	Siar	m2	2,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (III)			12,07			8,63			0,85			9,47
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	853,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	2.132,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (IV)			5,86			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	118,07	0,14	-	-	-	59,14	50,09	0,072	59,14	50,09	0,072
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	53,67	0,25	-	-	-	26,88	50,09	0,126	26,88	50,09	0,126
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	42,93	0,27	-	-	-	21,51	50,09	0,136	21,51	50,09	0,136
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	214,67	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	29,62	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	343,49	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	31,60	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (V)			1,95			-			0,33			0,33
	JUMLAH (I s/d V)			100,00			60,52			19,99			80,51
	PPN 11 %												
	TOTAL												
	PEMBULATAN			100,00			60,52			19,99			80,51

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LING PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER
Kantor: Graha Inti Perkasa
Jl. Raden Inten II no.156 B RT.008 RW 005 Kel.Duren Sawit Jakarta Timur 13440
Telp.(021) 48673407, 8625301, Email: Pisamudraa@yahoo.co.id

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Tanggal Addendum-1	:	16 Oktober 2025
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 13 (Tiga Belas)
Periode Tanggal	:	24 November 2025 s/d 30 November 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,31	0,92	0,06	0,98
II	PEKERJAAN TANAH	78,81	69,78	5,97	75,76
III	PEKERJAAN DRAINASE	12,07	9,47	1,35	10,83
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	5,86	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	1,95	0,33	0,33	0,67
A.	TOTAL BIAYA	100,00	80,51	7,72	88,23
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				88,23
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				64,20
	3. DEVIASI				24,02

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 13 (Tiga Belas)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 13															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,26	0,09	0,09															0,09	
2.	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3.	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)																					
	a. Penyiapan RK3K	1,00	Paket	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	Paket	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	Paket	0,65	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	Paket	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	Paket	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**PEKERJAAN TANAH**																					
1.	Pekerjaan Pembersihan Lahan	53.957,29	m2	11,82			2,96	2,96	2,96	2,96												
2.	Pekerjaan Galian Tanah	40.921,03	m3	50,01						3,19	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
3.	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	31.883,89	m3	7,93									0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
4.	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	118.538,62	m2	9,05									1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE II**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	506,16	m1	0,46									0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
a.2	Galian Tanah Drainase	1.840,53	m3	2,25									0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32			
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	36,29	m3	0,07									0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	28,15	m3	0,28									0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	362,81	m3	5,51									0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	1.103,77	m2	0,62									0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
a.7	Siar	706,41	m2	0,16									0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			
B.	**PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	129,20	m1	0,12											0,06	0,06						
a.2	Galian Tanah Drainase	27,08	m3	0,03											0,02	0,02						
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	6,77	m3	0,01											0,00	0,00						
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	3,39	m3	0,03											0,02	0,02						
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	107,58	m3	1,63											0,82	0,82						
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	42,32	m2	0,02											0,01	0,01						
a.7	Siar	264,70	m2	0,06											0,03	0,03						
C.	**PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING**																					
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	456,33	m3	0,66											0,13	0,13	0,13	0,13	0,13			
D.	**PEMBUATAN PLAT DECKER**																					
d.1	Pekerjaan Beton	1,32	m3	0,02														0,01	0,01			
d.2	Pekerjaan Pembesian	173,32	kg	0,03														0,02	0,02			
d.3	Pekerjaan Begisting	10,68	m2	0,02														0,01	0,01			
d.4	Pemasangan Bouwplank	17,76	m1	0,02														0,01	0,01			
d.5	Galian Tanah Drainase	2,52	m3	0,00														0,00	0,00			
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	0,72	m3	0,00														0,00	0,00			
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	0,36	m3	0,00														0,00	0,00			
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	3,66	m3	0,06														0,03	0,03			
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	4,50	m2	0,00														0,00	0,00			
d.10	Siar	2,83	m2	0,00														0,00	0,00			
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	853,00	Buah	1,99														0,50	0,50	0,50	0,50	
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	2.132,50	m1	3,81														0,97	0,97	0,97	0,97	
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	118,07	m3	0,14																0,07	0,07	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	53,67	m3	0,25																0,13	0,13	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	42,93	m3	0,27																0,14	0,14	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	214,67	m2	0,08																0,04	0,04	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	29,62	Ton	0,55																0,28	0,28	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	343,49	m2	0,05																0,02	0,02	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	31,60	Ton	0,61																0,30	0,30	
	RENCANA FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54												
	REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92	8,56												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01	16,58												
	RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,16	3,02	3,02	3,02	6,20	4,32	4,32	7,54	7,54	8,62	8,62	7,67	9,21	9,21	8,64	8,73	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,33	3,34	6,36	9,38	15,58	19,90	24,21	31,75	39,29	47,91	56,54	64,20	73,41	82,63	91,27	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										9,82	16,23	4,58	3,82	10,49	19,99	7,72					
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										25,40	41,63	46,21	50,03	60,52	80,51	88,23					
	DEVIASI										5,50	17,42	14,46	10,74	12,61	23,97	24,02					

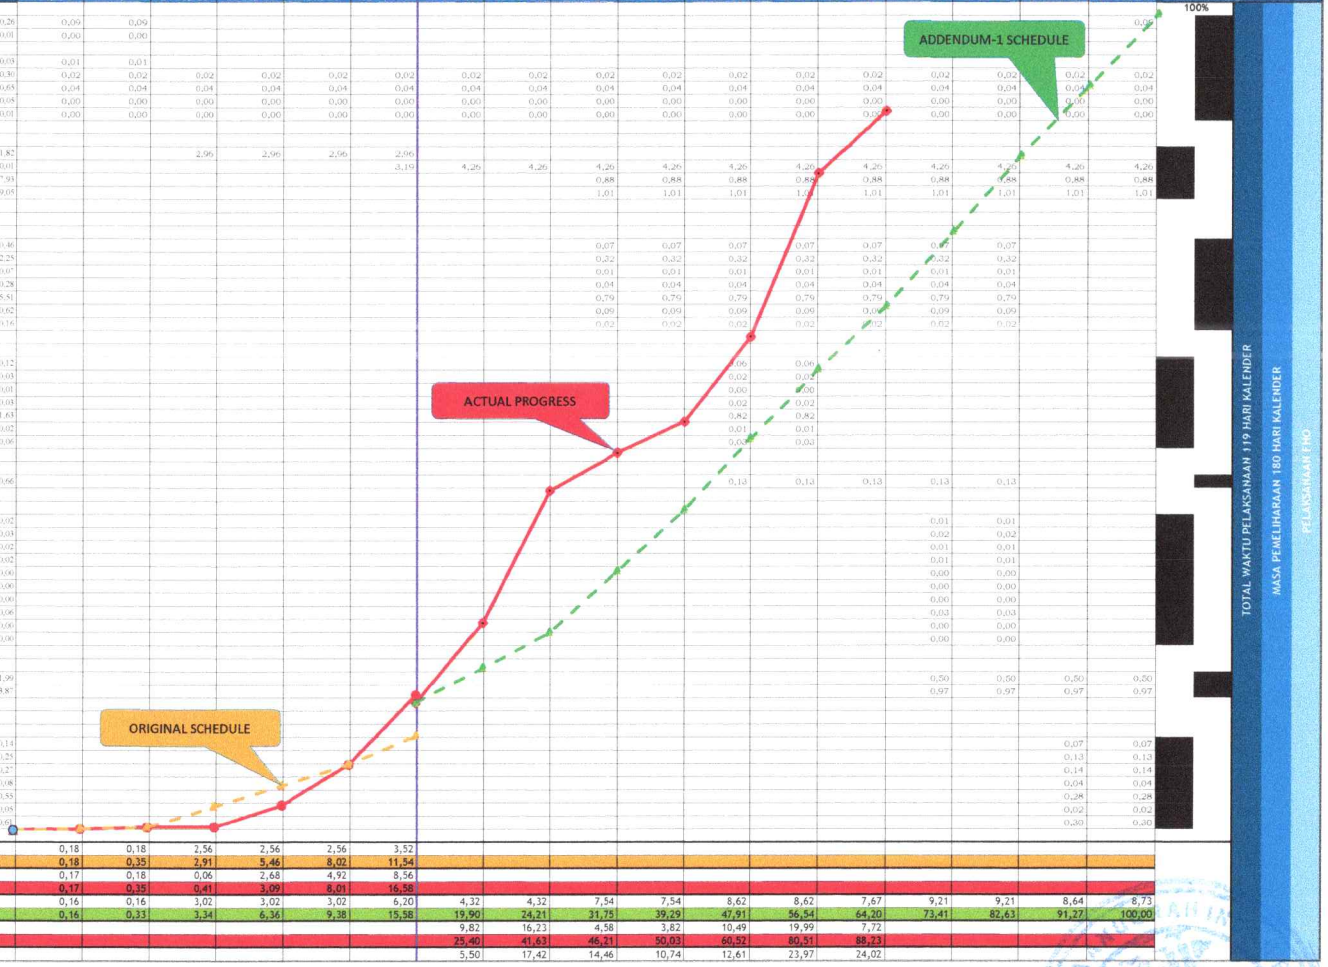

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 24 November 2025 s/d 30 November 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 13 (Tiga Belas)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - NOVEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	ADD-1			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,26	0,64	64,10	0,17	-	-	-	0,64	64,10	0,17
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,30	0,71	70,77	0,21	0,06	5,88	0,02	0,77	76,65	0,23
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,65	0,71	70,77	0,46	0,06	5,88	0,04	0,77	76,65	0,50
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,71	70,77	0,03	0,06	5,88	0,00	0,77	76,65	0,04
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,71	70,77	0,01	0,06	5,88	0,00	0,77	76,65	0,01
		Sub Jumlah (I)		1,31			0,92			0,06			0,98
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	53.957,29	11,82	53.957,29	100,00	11,82	-	-	-	53.957,29	100,00	11,82
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	40.921,03	50,01	35.589,03	86,97	43,50	3.562,00	8,70	4,35	39.151,03	95,67	47,85
3	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	m3	31.883,89	7,93	28.073,56	88,05	6,98	2.810,33	8,81	0,70	30.883,89	96,86	7,68
4	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	m2	118.538,62	9,05	98.045,23	82,71	7,48	12.052,39	10,17	0,92	110.097,62	92,88	8,40
		Sub Jumlah (II)		78,81			69,78			5,97			75,76
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE II												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m1	506,16	0,46	444,00	87,72	0,40	44,40	8,77	0,040	488,40	96,49	0,442
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.840,53	2,25	1.637,36	88,96	2,00	166,75	9,06	0,204	1.804,11	98,02	2,205
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	56,29	0,07	50,08	88,96	0,06	5,10	9,06	0,007	55,18	98,02	0,071
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	28,15	0,28	25,04	88,96	0,25	2,55	9,06	0,026	27,59	98,02	0,277
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	362,81	5,51	322,76	88,96	4,90	32,87	9,06	0,499	355,63	98,02	5,396
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	1.103,77	0,62	981,93	88,96	0,55	100,00	9,06	0,056	1.081,93	98,02	0,609
a.7	Siar	m2	706,41	0,16	628,43	88,96	0,14	64,00	9,06	0,015	692,43	98,02	0,157
B.	PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m1	129,20	0,12	30,00	23,22	0,03	7,54	5,84	0,007	37,54	29,06	0,034
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	27,08	0,03	6,78	25,04	0,01	19,95	73,68	0,024	26,73	98,71	0,033
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	6,77	0,01	1,70	25,04	0,00	2,26	33,32	0,003	3,95	58,36	0,005
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	3,39	0,03	0,85	25,04	0,01	1,13	33,32	0,011	1,98	58,36	0,020
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	107,58	1,63	28,82	26,79	0,44	19,36	18,00	0,294	48,17	44,78	0,731
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	42,32	0,02	11,87	28,04	0,01	14,81	34,99	0,008	26,67	63,03	0,015
b.7	Siar	m2	264,70	0,06	67,80	25,61	0,02	21,01	7,94	0,005	88,81	33,55	0,020
C.	PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING												
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	m3	456,33	0,66	456,33	100,00	0,66	-	-	-	456,33	100,00	0,656
D.	PEMBUATAN PLAT DECKER												
d.1	Pekerjaan Beton	m3	1,32	0,02	-	-	-	1,32	100,00	0,017	1,32	100,00	0,017
d.2	Pekerjaan Pembesian	kg	173,32	0,03	-	-	-	173,32	100,00	0,031	173,32	100,00	0,031
d.3	Pekerjaan Begisting	m2	10,68	0,02	-	-	-	10,68	100,00	0,024	10,68	100,00	0,024
d.4	Pemasangan Bouwplank	m1	17,76	0,02	-	-	-	17,76	100,00	0,016	17,76	100,00	0,016
d.5	Galian Tanah Drainase	m3	2,52	0,00	-	-	-	2,52	100,00	0,003	2,52	100,00	0,003
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	0,72	0,00	-	-	-	0,72	100,00	0,001	0,72	100,00	0,001
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	0,36	0,00	-	-	-	0,36	100,00	0,004	0,36	100,00	0,004
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	3,66	0,06	-	-	-	3,66	100,00	0,056	3,66	100,00	0,056
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	m2	4,50	0,00	-	-	-	4,50	100,00	0,003	4,50	100,00	0,003
d.10	Siar	m2	2,83	0,00	-	-	-	2,83	100,00	0,001	2,83	100,00	0,001
		Sub Jumlah (III)		12,07			9,47			1,35			10,83
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	853,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	2.132,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (IV)		5,86			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	118,07	0,14	59,14	50,09	0,07	58,93	49,91	0,072	118,07	100,00	0,144
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	53,67	0,25	26,88	50,09	0,13	26,78	49,91	0,125	53,67	100,00	0,251
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	42,93	0,27	21,51	50,09	0,14	21,43	49,91	0,136	42,93	100,00	0,272
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	214,67	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	29,62	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	343,49	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	31,60	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah (V)		1,95			0,33			0,33			0,67
		JUMLAH (I s/d V)		100,00			80,51			7,72			88,23
		PPN 11 %											
		TOTAL											
		PEMBULATAN		100,00			80,51			7,72			88,23

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE

PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER
Kantor: Graha Inti Perkasa
Jl. Raden Inten II no.15B RT.008 RW.005 Kel.Duren Sawit Jakarta Timur 13440
Telp.(021) 48672407,8625301, Email: Ptsamudraa@yahoo.co.id

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN - ENDE

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Kontrak	:	KU.003/9/224/HHA-2025
Tanggal Kontrak	:	04 September 2025
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Tanggal Addendum-1	:	16 Oktober 2025
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Minggu Ke -	:	- 14 (Empat Belas)
Periode Tanggal	:	01 Desember 2025 s/d 07 Desember 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	KEMAJUAN MINGGU LALU (%)	KEMAJUAN DALAM MINGGU INI (%)	KEMAJUAN S/D MINGGU INI (%)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,31	0,98	0,06	1,04
II	PEKERJAAN TANAH	78,81	75,76	0,27	76,03
III	PEKERJAAN DRAINASE	12,07	10,83	1,24	12,07
IV	PEMENUHAN STANDAR PAGAR	5,86	0,00	0,00	0,00
V	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP - PK	1,95	0,67	0,63	1,30
A.	TOTAL BIAYA	100,00	88,23	2,20	90,43
B.	PPN (11%)				
C.	TOTAL BIAYA TERMASUK PPN				
D.	TOTAL BIAYA DIBULATKAN				
E.	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN				
	1. TOTAL REALISASI BOBOT				90,43
	2. TOTAL RENCANA BOBOT FISIK				73,41
	3. DEVIASI				17,02

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
HAJI HASAN AROEBOESMAN – ENDE


PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Engineering & Management Consultant

PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
GENERAL TRADE, CONTRACTOR & SUPPLIER

PROGRESS KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE - 14 (Empat Belas)

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN MINGGU KE - 14															KETERANGAN
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					4-Sep-25	8-Sep-25	15-Sep-25	22-Sep-25	29-Sep-25	6-Okt-25	13-Okt-25	20-Okt-25	27-Okt-25	3-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	24-Nov-25	1-Des-25	8-Des-25	15-Des-25	22-Des-25	
					7-Sep-25	14-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	5-Okt-25	12-Okt-25	19-Okt-25	26-Okt-25	2-Nov-25	9-Nov-25	16-Nov-25	23-Nov-25	30-Nov-25	7-Des-25	14-Des-25	21-Des-25	28-Des-25	
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	ls	0,26	0,09	0,09															0,09	
2.	Papan Nama	1,00	ls	0,01	0,00	0,00																
3.	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja)																					
	a. Penyiapan RK3K	1,00	Paket	0,03	0,01	0,01																
	b. Alat Pelindung Kerja	1,00	Paket	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
	c. Personil Kerja	1,00	Paket	0,65	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	1,00	Paket	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. Rambu-rambu	1,00	Paket	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	**PEKERJAAN TANAH**																					
1.	Pekerjaan Pembersihan Lahan	53.957,29	m2	11,82			2,96	2,96	2,96	2,96												
2.	Pekerjaan Galian Tanah	40.921,03	m3	30,01						3,19	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
3.	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	31.883,89	m3	7,93									0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
4.	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	118.538,62	m2	9,05									1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
III.	**PEKERJAAN DRAINASE**																					
A.	**TYPE II**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	506,16	m1	0,86									0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			
a.2	Galian Tanah Drainase	1.840,53	m3	2,23									0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32			
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	56,49	m3	0,07									0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	28,15	m3	0,28									0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	362,81	m3	5,51									0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79			
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	1.103,77	m2	0,62									0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09			
a.7	Siar	706,41	m2	0,16									0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			
B.	**PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING**																					
a.1	Pemasangan Bouwplank	129,20	m1	0,12											0,06	0,06						
a.2	Galian Tanah Drainase	27,08	m3	0,03											0,02	0,02						
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	6,77	m3	0,01											0,00	0,00						
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	3,39	m3	0,03											0,02	0,02						
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	107,58	m3	1,63											0,82	0,82						
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	42,32	m2	0,02											0,01	0,01						
a.7	Siar	264,70	m2	0,06											0,03	0,03						
C.	**PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING**																					
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	456,33	m3	0,66											0,13	0,13	0,13	0,13	0,13			
D.	**PEMBUATAN PLAT DECKER**																					
d.1	Pekerjaan Beton	1,32	m3	0,02														0,01	0,01			
d.2	Pekerjaan Pembesian	173,32	kg	0,03														0,02	0,02			
d.3	Pekerjaan Begisting	10,68	m2	0,02														0,01	0,01			
d.4	Pemasangan Bouwplank	17,76	m1	0,02														0,01	0,01			
d.5	Galian Tanah Drainase	2,52	m3	0,00														0,00	0,00			
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	0,72	m3	0,00														0,00	0,00			
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	0,36	m3	0,00														0,00	0,00			
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	3,66	m3	0,06														0,03	0,03			
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2,5 cm	4,50	m2	0,00														0,00	0,00			
d.10	Siar	2,83	m2	0,00														0,00	0,00			
IV.	**PEMENUHAN STANDAR PAGAR**																					
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	853,00	Buah	1,99														0,50	0,50	0,50	0,50	
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	2.132,50	m1	3,87														0,97	0,97	0,97	0,97	
V.	**PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
A.	**PEKERJAAN PELEBARAN JALAN AKSES PKP-PK**																					
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	118,07	m3	0,14																0,07	0,07	
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	53,67	m3	0,25																0,13	0,13	
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	42,93	m3	0,27																0,14	0,14	
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1,5 Ltr/m2	214,67	m2	0,08																0,04	0,04	
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	29,62	Ton	0,55																0,28	0,28	
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0,55 Ltr/m2	343,49	m2	0,05																0,02	0,02	
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	31,60	Ton	0,60																0,30	0,30	
	RENCANA FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,18	2,56	2,56	2,56	3,52												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,18	0,35	2,91	5,46	8,02	11,54												
	REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,18	0,06	2,68	4,92	8,56												
	KOMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU KONTRAK				0,17	0,35	0,41	3,09	8,01	16,58												
	RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,16	3,02	3,02	3,02	6,20	4,32	4,32	7,54	7,54	8,62	8,62	7,67	9,21	9,21	8,64	8,73	
	KUMULATIF RENCANA FISIK PER MINGGU CCO-1				0,16	0,33	3,34	6,36	9,38	15,58	19,90	24,21	31,75	39,29	47,91	56,54	64,20	73,41	82,63	91,27	100,00	
	REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										9,82	16,23	4,58	3,82	10,49	19,99	7,72	2,20				
	KUMULATIF REALISASI FISIK PER MINGGU CCO-1										25,40	41,63	46,21	50,03	60,52	80,51	88,23	90,43				
	DEVIASI										5,50	17,42	14,46	10,74	12,61	23,97	24,02	17,02				

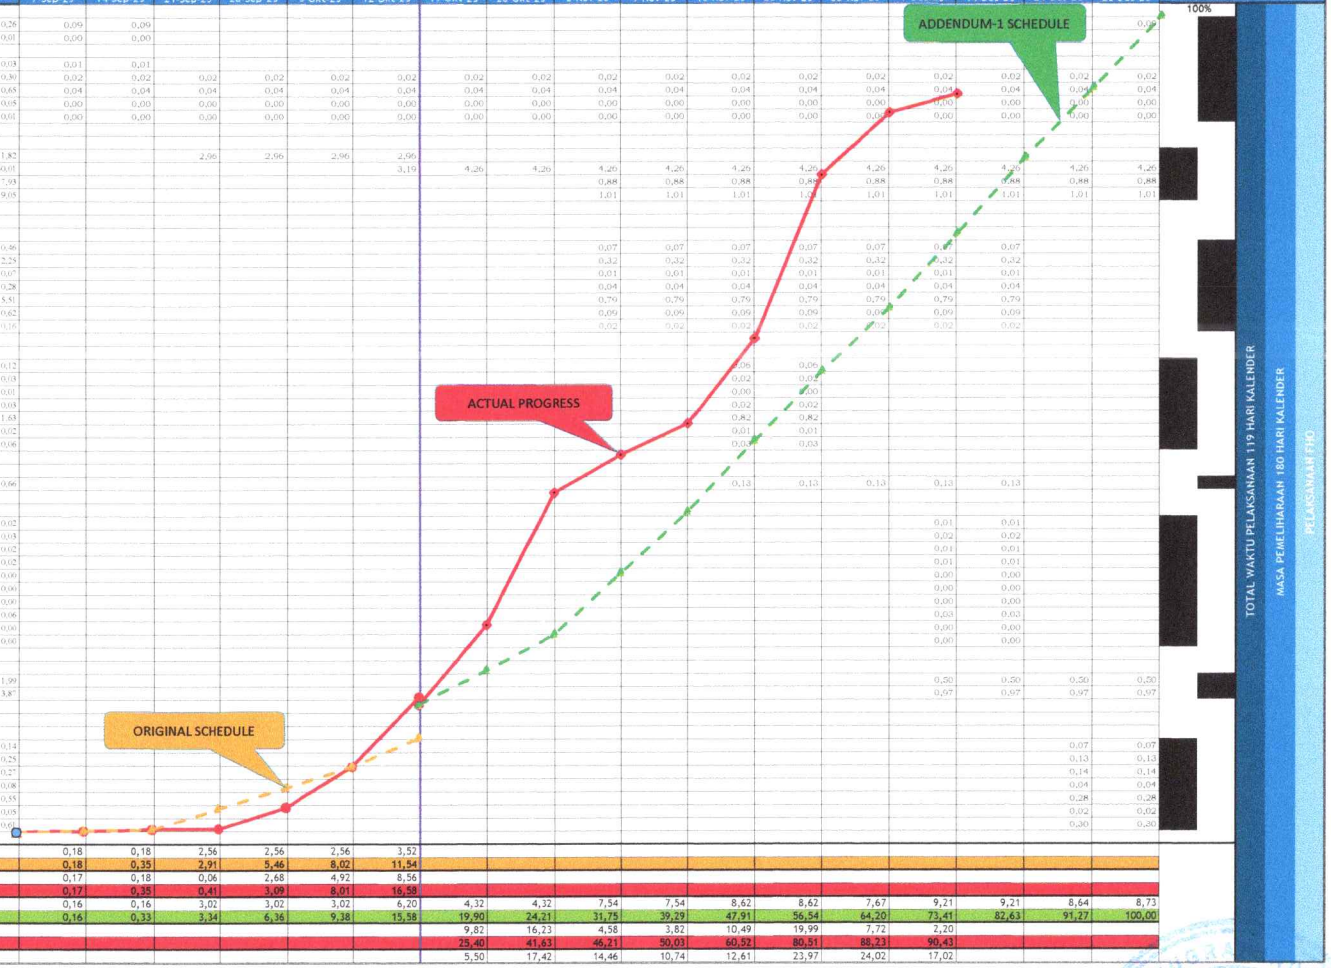

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS LINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

SEPTEMBER - DESEMBER 2025

PERIODE TANGGAL : 01 Desember 2025 s/d 07 Desember 2025

Kegiatan	:	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Normalisasi Runway Strip
Pekerjaan	:	Normalisasi Runway Strip
Lokasi	:	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman, Nusa Tenggara Timur
UPT/Satker	:	UPBU H. Hasan Aroeboesman - ENDE
Tahun Anggaran	:	APBN TAHUN 2025
Kontraktor Pelaksana	:	PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
No. Addendum-1	:	KU.003/10/331/HHA-2025
Konsultan Pengawas	:	PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA
Nilai Addendum-1	:	RP 11.922.488.000,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Minggu ke	:	- 14 (Empat Belas)
Bulan / Tahun	:	SEPTEMBER - DESEMBER 2025

No	Uraian Pekerjaan	ADD-1			REALISASI YANG DICAPAI								
					S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		Sat.	Volume	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)	Volume	Prestasi (%)	Bobot (%)
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	0,26	0,64	64,10	0,17	-	-	-	0,64	64,10	0,17
2	Papan Nama	ls	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01	-	-	-	1,00	100,00	0,01
3	SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja												
	a. Penyiapan RK3K	pkt	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03	-	-	-	1,00	100,00	0,03
	b. Alat Pelindung Kerja	pkt	1,00	0,30	0,77	76,65	0,23	0,06	5,88	0,02	0,83	82,53	0,25
	c. Personil Kerja	pkt	1,00	0,65	0,77	76,65	0,50	0,06	5,88	0,04	0,83	82,53	0,54
	d. Fasilitas Sarana Kesehatan	pkt	1,00	0,05	0,77	76,65	0,04	0,06	5,88	0,00	0,83	82,53	0,04
	e. Rambu-rambu	pkt	1,00	0,01	0,77	76,65	0,01	0,06	5,88	0,00	0,83	82,53	0,01
	Sub Jumlah (I)			**1,31**			**0,98**			**0,06**			**1,04**
II.	PEKERJAAN TANAH												
1	Pekerjaan Pembersihan Lahan	m2	53.957,29	11,82	53.957,29	100,00	11,82	-	-	-	53.957,29	100,00	11,82
2	Pekerjaan Galian Tanah	m3	40.921,03	50,01	39.151,03	95,67	47,85	140,00	0,34	0,17	39.291,03	96,02	48,02
3	Pekerjaan Perataan Timbunan (dari dalam)	m3	31.883,89	7,93	30.883,89	96,86	7,68	185,00	0,58	0,05	31.068,89	97,44	7,72
4	Pekerjaan Pemadatan (dari dalam)	m2	118.538,62	9,05	110.097,62	92,88	8,40	700,00	0,59	0,05	110.797,62	93,47	8,46
	Sub Jumlah (II)			**78,81**			**75,76**			**0,27**			**76,03**
III.	PEKERJAAN DRAINASE												
A.	TYPE II												
a.1	Pemasangan Bouwplank	m1	506,16	0,46	488,40	96,49	0,44	17,76	3,51	0,016	506,16	100,00	0,458
a.2	Galian Tanah Drainase	m3	1.840,53	2,25	1.804,11	98,02	2,21	36,42	1,98	0,045	1.840,53	100,00	2,250
a.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	56,29	0,07	55,18	98,02	0,07	1,11	1,98	0,001	56,29	100,00	0,073
a.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	28,15	0,28	27,59	98,02	0,28	0,56	1,98	0,006	28,15	100,00	0,283
a.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	362,81	5,51	355,63	98,02	5,40	7,18	1,98	0,109	362,81	100,00	5,505
a.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	1.103,77	0,62	1.081,93	98,02	0,61	21,84	1,98	0,012	1.103,77	100,00	0,621
a.7	Siar	m2	706,41	0,16	692,43	98,02	0,16	13,98	1,98	0,003	706,41	100,00	0,160
B.	PERBAIKAN DINDING SALURAN EKSISTING												
b.1	Pemasangan Bouwplank	m1	129,20	0,12	37,54	29,06	0,03	91,66	70,94	0,083	129,20	100,00	0,117
b.2	Galian Tanah Drainase	m3	27,08	0,03	26,73	98,71	0,03	0,35	1,29	0,000	27,08	100,00	0,033
b.3	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	6,77	0,01	3,95	58,36	0,01	2,82	41,64	0,004	6,77	100,00	0,009
b.4	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	3,39	0,03	1,98	58,36	0,02	1,41	41,64	0,014	3,39	100,00	0,034
b.5	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	107,58	1,63	48,17	44,78	0,73	59,40	55,22	0,901	107,58	100,00	1,632
b.6	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	42,32	0,02	26,67	63,03	0,02	15,65	36,97	0,009	42,32	100,00	0,024
b.7	Siar	m2	264,70	0,06	88,81	33,55	0,02	175,89	66,45	0,040	264,70	100,00	0,060
C.	PEMBERSIHAN SEDIMENT SALURAN EKSISTING												
c.1	Galian Sediment Drainase Kota	m3	456,33	0,66	456,33	100,00	0,66	-	-	-	456,33	100,00	0,656
D.	PEMBUATAN PLAT DECKER												
d.1	Pekerjaan Beton	m3	1,32	0,02	1,32	100,00	0,02	-	-	-	1,32	100,00	0,017
d.2	Pekerjaan Pembesian	kg	173,32	0,03	173,32	100,00	0,03	-	-	-	173,32	100,00	0,031
d.3	Pekerjaan Begisting	m2	10,68	0,02	10,68	100,00	0,02	-	-	-	10,68	100,00	0,024
d.4	Pemasangan Bouwplank	m1	17,76	0,02	17,76	100,00	0,02	-	-	-	17,76	100,00	0,016
d.5	Galian Tanah Drainase	m3	2,52	0,00	2,52	100,00	0,00	-	-	-	2,52	100,00	0,003
d.6	Urugan Pasir t = 10 cm	m3	0,72	0,00	0,72	100,00	0,00	-	-	-	0,72	100,00	0,001
d.7	Lantai Kerja t = 5 cm	m3	0,36	0,00	0,36	100,00	0,00	-	-	-	0,36	100,00	0,004
d.8	Pas. Batu Kali 1 : 5	m3	3,66	0,06	3,66	100,00	0,06	-	-	-	3,66	100,00	0,056
d.9	Plesteran 1 : 3 t = 2.5 cm	m2	4,50	0,00	4,50	100,00	0,00	-	-	-	4,50	100,00	0,003
d.10	Siar	m2	2,83	0,00	2,83	100,00	0,00	-	-	-	2,83	100,00	0,001
	Sub Jumlah (III)			**12,07**			**10,83**			**1,24**			**12,07**
IV.	PEMENUHAN STANDAR PAGAR												
1.	Pasangan Besi V (Hotdip Galvanis)	Buah	853,00	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pasangan Kawat Razor BTO-22	m	2.132,50	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (IV)			**5,86**			-			-			-
V.	PERLUASAN DAN PELAPISAN JALAN AKSES PKP-PK												
A.	PEKERJAAN PELEBARAN JALANS AKSES PKP-PK												
a.1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	118,07	0,14	118,07	100,00	0,14	-	-	-	118,07	100,00	0,144
a.2	Pekerjaan Sub Base Course Tebal 25 cm	m3	53,67	0,25	53,67	100,00	0,25	-	-	-	53,67	100,00	0,251
a.3	Pekerjaan Base Course Tebal 20 cm	m3	42,93	0,27	42,93	100,00	0,27	-	-	-	42,93	100,00	0,272
a.4	Pekerjaan Prime Coat 1.5 Ltr/m2	m2	214,67	0,08	-	-	-	214,67	100,00	0,078	214,67	100,00	0,078
a.5	Pekerjaan Asphalt Concrete-Binder Course T = 6cm	Ton	29,62	0,55	-	-	-	29,62	100,00	0,552	29,62	100,00	0,552
a.6	Pekerjaan Tack Coat 0.55 Ltr/m2	m2	343,49	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.7	Pekerjaan Asphalt Concrete-Wearing Course T = 4cm	Ton	31,60	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (V)			**1,95**			**0,67**			**0,63**			**1,30**
	JUMLAH (I s/d V)			100,00			88,23			2,20			90,43
	PPN 11 %												
	TOTAL												
	PEMBULATAN			100,00			88,23			2,20			90,43

Disetujui Oleh,
Direksi Pengawas
KANTOR UPBU H. HASAN AROEBOESMAN - ENDE

MATHEOS BORU
Penata Muda Tk. I (III/d)
NIP. 19801206 200212 1 005

Diperiksa Oleh,
Konsultan Pengawas
PT. FISTLIGHT ALDYTO WAHANA

Ir. ANDARIAS KINO PADANG
Team Leader

Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI

NYOMAN THRISNA WIRAWAN
Manager Teknik
